CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2019

ANEXOS DEL TOMO II "EJERCICIO PRESUPUESTAL INTEGRADO DEL PODER EJECUTIVO"

VOLUMEN 8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

FINALIDAD 02 DESARROLLO SOCIAL

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

FICHA 184 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS GEOLOGO EZEQUIEL ORDÓÑEZ 111997 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel del Jardín de Niños Geólogo Ezequiel Acción terminada. Ordóñez en la comunidad de San Nicolás Peralta, Lerma, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 250 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: San Nicolás Peralta, Lerma, México.

Costo de la Obra en 2019: \$63,727.72

Ejercido 2019: \$62,164.62

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 04/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas, retiro y elaboración de aplanados, cambio de puertas en interior de aulas, pintura general del plantel. Elaboración de entortado, pretil e impermeabilización de losas de azotea de aulas.



FICHA 185 IMIFE

JARDIN DE NINOS AGUSTÍN YÁÑEZ 112153 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010102 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación del Plantel del Jardín de Niños Agustín Yáñez ubicado Acción terminada. en la comunidad de San Carlos Autopan, Toluca, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 67 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: San Carlos Autopan, Toluca, México.

Costo de la Obra en 2019: \$85,481.59

Ejercido 2019: \$85,787.06

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de loseta en aulas, firme en patio y andadores, colocación de loseta en aulas, así como impermeabilización.



FICHA 186 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS JOSÉ GUADALUPE POSADA 112526 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en el Jardín de Niños José Guadalupe Obra en proceso. Posada, Tlacuitlapa, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 75 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Tlacuitlapa, Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$61,564.84

Ejercido 2019: \$58,317.71

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realiza construcción de aula estructura Regional (Trabajos preliminares, cimentación y estructura, se dio inicio a trabajos de albañilería), obra inactiva.



FICHA 187 **IMIFE**

JARDÍN DE NIÑOS LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 112167 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Jardín de niños Licenciado Adolfo López Mateos, Obra en proceso. Santiago Tianguistenco de Galeana, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 55 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Santiago Tianguistenco de Galeana,

Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,500,000.00

Ejercido 2019: \$1,496,280.07

Fecha de Inicio: 09/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realiza construcción de aulas con Estructura Regional (Trabajos preliminares, cimentación y estructura, se dio inicio a trabajos de albañilería), "obra inactiva".



FICHA 188 IMIFE

PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 114166 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel Preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, San Gabriel Zepayautla, Tenancingo, México.

Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Apr

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: San Gabriel Zepayautla, Tenancingo,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$450,000.00

Ejercido 2019: \$445,708.02

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 189 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS ALFONSO GARCÍA ROBLES 112520 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en el Jardín de niños Alfonso García Obra en proceso. Robles ubicado en la comunidad de Ahuatenco, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 35 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Ahuatenco, Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$70,362.32

Ejercido 2019: \$66,976.28

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de cancelería y protecciones, rehabilitación de sanitarios, colocación de barandales, construcción de barda perimetral y rehabilitación eléctrica.



FICHA 190 IMIFE

JARDIN DE NINOS VASCO DE QUIROGA 112474 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en el Jardín de niños Vasco de Acción terminada. Quiroga ubicado en la localidad de Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 360 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$26,932.47

Ejercido 2019: \$25,191.77

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 05/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 191 IMIFF

JARDIN DE NINOS EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS 111401 CONSTRUCCIÓN DE AULA PERIMETRAL, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de Aula Perimetral, Demolición y Construcción de 1 Aula y Obra Exterior en el Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos ubicado en Coamilpa de Juárez, Tianguistenco, México. Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 40 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Coamilpa de Juárez, Tianguistenco,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$502,269.57

Ejercido 2019: \$489,581.96

Fecha de Inicio: 25/05/ 2019

Fecha de Terminación: 22/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realizaron trabajos de retiro de aplanados en aula y elaboración de los mismos, colocación de loseta cerámica y pintura vinílica, obra iniciativa.



FICHA 192 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS EDUARDO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA 111372 RECONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, AULAS Y OBRA EXTERIOR 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reconstrucción de Salón de Usos Múltiples, Aulas y Obra Exterior del Acción terminada. Jardín de Niños Eduardo Rodríguez Castañeda ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 40 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Santiago Tianguistenco de Galeana, Localización:

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$727,786.71

Ejercido 2019: \$709259.25

Fecha de Inicio: 28/05/2019

Fecha de Terminación: 26/07/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realizaron trabajos de construcción de barda perimetral y construcción de módulos sanitarios.



JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO 111815 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Jardín de Niños Lorenzo Filho Municipio de Tultitlan Estado de México.

Acción terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tultitlán de Mariano Escobedo

Costo de la Obra en 2019: \$631,626.74

Ejercido 2019: \$629,318.18

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y construcción de dos módulos de 3 aulas y núcleo sanitarios, así como barda perimetral.



FICHA 194 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI 112422 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Sor Juana Inés de la Cruz Municipio de Acción terminada.

Tultitlan Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tultitlan

Costo de la Obra en 2019: \$20,953.99

Ejercido 2019: \$20,072.39

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 28/09/019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de pisos de concreto, instalación eléctrica, hidráulica, construcción de cisterna, aplanado, pintura, limpia.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 550 alumnos.



FICHA 195 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS GABRIELA BRIMMER 112297 MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN GENERAL 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Jardín De Niños Gabriela Brimmer, ubicado

en Huehuetoca, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Huehuetoca

Costo de la Obra en 2019: \$182,688.31

Ejercido 2019: \$177,687.03

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019


DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de pintura, acabados, colocación de piso de cerámica.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.

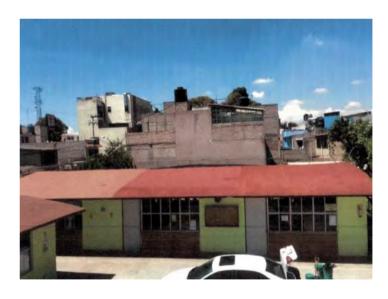

FICHA 196 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 111820 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación Jardín De Niños Gabriel García Márquez Acción terminada.

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Aproximadamente 150

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$649,132.33

Fecha de Inicio: 04/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Impermeabilización de 2 Edificios U1-C así como pintura vinílica en interiores como exteriores



FICHA 197 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO 111823 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación Jardín De Niños José Clemente Orozco.

Acción terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Coacalco

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$649,687.39

Fecha de Inicio: 04/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas y pavimentación.



FICHA 198 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO 112338 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación Jardín De Niños Anton Makarenko, Cuautitlan Izcalli, Acción terminada.

México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$1,031,788.30

Ejercido 2019: \$1,029,912.58

Fecha de Inicio: 04/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas y pavimentación, impermeabilización.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 300 alumnos.



FICHA 199 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS 115670-004 REPARACIÓN DE BARDA 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación Jardín De Niños Rosario Castellano, ubicado en Paseo

de los Álamos s/n, Municipio de Huehuetoca, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Paseo de los Álamos s/n, Municipio de

Huehuetoca, México

Costo de la Obra en 2019: \$351,000.00

Ejercido 2019: \$351,000.00

Fecha de Inicio: 04/11/2019

Fecha de Terminación: 19/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación se está rehabilitando 200 M de Barda.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 750 alumnos.



FICHA 200 IMIFF

JARDIN DE NIÑOSJACOBO HERNANDEZ MARIN 111754 MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION 020501010102

ANTECEDENTES

acobo Acción terminada.

Muro de Contención y Rehabilitación, en el Jardín de Niños Jacobo Hernández Marín, ubicado en Cabecera de Indígenas 2do Cuartel, Municipio de Donato Guerra.

BENEFICIOS GENERADOS

TRABAJOS EJECUTADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 40 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Municipio de Donato Guerra.

Costo de la Obra en 2019: \$1,950,000.00

Ejercido 2019: \$1,942,599.20

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación del plantel, rehabilitación de mamposterías en terrazas, pintura en plafond, muros y zoclos, colocación de firme de concreto en plaza cívica y andadores, impermeabilización.



FICHA 201 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER 112110 SUSTITUCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación Jardín De Niños Enrique Laubscher en el Municipio de Acción terminada.

Tecámac

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Tecámac de Felipe Villanueva Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$694,022.91

Ejercido 2019: \$694,022.91

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 180 alumnos.



FICHA 202 **IMIFE**

PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS 112292 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Rosario Castellanos, ubicada en el Acción terminada. Municipio de Ecatepec, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$1,578,001.64

Ejercido 2019: \$1,569,374.95

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 2 aulas, obra exterior y acceso.



FICHA 203 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS MIGUEL NOREÑA 111744 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Jardín De Niños Miguel Noreña en el Acción terminada.

Municipio de Tonanitla estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Santa María Tonanitla Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$311,550.45

Ejercido 2019: \$307,205.67

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de demolición de 3 aulas y núcleo sanitario.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 490 alumnos.



FICHA 204 IMIFE

PRIMARIA MIGUEL DE LA MADRID 112131 REHABILITACIÓN 02050101012

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Miguel De La Madrid En El Acción terminada. Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$134,072.97

Ejercido 2019: \$133,302.43

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de barda, y demolición y reconstrucción de muros en aulas, pintura, malla ciclónica en barda.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 205 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 112075 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Jardín De Niños Gabriela Mistral En El Acción terminada.

Municipio de Acolman

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: San Bartolo

Costo de la Obra en 2019: \$58,335.89

Ejercido 2019: \$55,401.09

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de aplanados, pintura general, impermeabilización, plaza cívica y aulas.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 206 **IMIFE**

PRIMARIA JOSÉ MARTÍ 112291 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria José Martí en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$490,055.75

Ejercido 2019: \$489,842.02

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de aplanados, pintura general, impermeabilización.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 207 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS 112081 REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Jardín De Niños Rosario Castellanos en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$615,886.98

Ejercido 2019: \$611,794.05

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de pintura, aplanados, cambio de instalación hidro-sanitaria y muebles sanitarios.



FICHA 208 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 112321 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín De Niños Federico Froebel en el Acción terminada.

Municipio de Tecámac estado de México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tecámac de Felipe Villanueva

Costo de la Obra en 2019: \$70,000.00

Ejercido 2019: \$68,729.80

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 23/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de aplanados, pintura general, impermeabilización.



FICHA 209 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS ALFONSO FABILA 112296 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín De Niños Alfonso Favila en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$423,260.00

Ejercido 2019: \$417,709.40

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de impermeabilización aplanados, pintura, cancelería, loseta y sanitarios.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 600 alumnos.



FICHA 210 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI 112402 MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN GENERAL 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín De Niños María Montessori en el Acción terminada.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tecámac de Felipe Villanueva

Costo de la Obra en 2019: \$147,471.43

Ejercido 2019: \$148,426.44

Fecha de Inicio: 14/09/2019

Fecha de Terminación: 12/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de barda perimetral, aplanados, pintura y malla ciclónica

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 211 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO 112532 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SS, TORRE DE TINACO, DESPLANTE DE 25 CM DE ALTURA 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Jardín De Niños Frida Khalo En El Acción terminada. Municipio De Ecatepec Estado De México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$468,290.19


Ejercido 2019: \$468,394.88

Fecha de Inicio: 09/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de tres aulas, ss, torre de tinaco, desplante de 25 cm de altura.

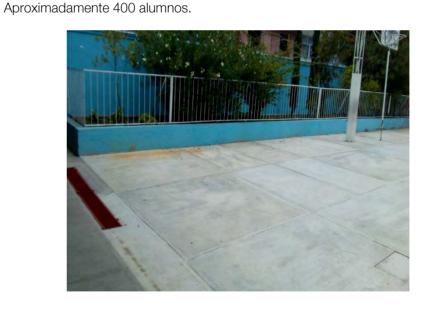

FICHA 212 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO 112357 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín de Niños Antonio Caso en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$137,212.41

Ejercido 2019: \$129,614.41

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 22/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de aplanados, pintura, cancelería de aluminio e impermeabilización

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 213 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS MANUEL FLORES 112359 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE 3 MÓDULOS REGIONALES Y BARDA PERIMETRAL 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín De Niños Manuel Flores en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$248,173.83

Ejercido 2019: \$238,795.23

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de la rehabilitación de 3 módulos regionales y barda perimetral.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 450 alumnos.



FICHA 214 IMIFE

JARDIN DE NIÑOS MAXIMILIANO RUIZ 114386-214 CONSTRUCCIÓN DE BARDA, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE AULAS, OBRA EXTERIOR 020501010102

BENEFICIOS GENERADOS

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Jardin De Niños Maximiliano Ruiz En El Acción en proceso.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Leona Vicario s/n

Costo de la Obra en 2019: \$6,168,000.00

Ejercido 2019: \$6,162,000.00

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior



FICHA 215 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS LORENZO FILHO 111374 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación De Sanitarios en el Jardín de Niños Lorenzo Filho Acción terminada. ubicado en la localidad de San Mateo Coapexco (Ejido), Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 160 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

San Mateo Coapexco (Ejido), Villa Localización:

Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$348,381.00

Ejercido 2019: \$339,613.59

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 22/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 216 **IMIFF**

JARDIN DE NINOS CARMEN SERDÁN 111367 REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL, TECHUMBRE Y MUROS EN AULA 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Muro de Contención, Barda Perimetral, Techumbre y Obra en proceso. Muros en Aula en el Jardín de Niños Carmen Serdán ubicado en Tenancingo de Degollado, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 160 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Tenancingo de Degollado, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,138,547.49

Ejercido 2019: \$1,108,646.63

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 217 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS FEDERICO GARCÍA LORCA 111377 RETIRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE MULTIPANEL 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Retiro y Colocación de Cubierta a Base de Multipanel en el Jardín de Obra en proceso. Niños Federico García Lorca ubicada en San Juan Xochiaca, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: San Juan Xochiaca, Tenancingo,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$187,308.91

Ejercido 2019: \$182,564.62

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 23/07/2019

DATOS TÉCNICOS:

Zapata y contratrabes de concreto armado, muro de tabique rojo recocido y acabado de pintura.



FICHA 218 IMIFE

JARDIN DE NINOS ANGEL MARIA GARIBAY 112498 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en el Jardín de Niños Ángel María Obra en proceso. Garibay ubicado en la comunidad de Zacango, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Zacango, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,455,349.00

Ejercido 2019: \$2,449,185.92

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta, azulejo en muros, muebles sanitarios y herrería y aluminio.



FICHA 219 IMIFE

JARDIN DE NINOS MARÍA MONTESSORI 112446 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en el Jardín de Niños María Montessori Acción terminada. ubicado en la localidad de Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$110,189.05

Ejercido 2019: \$107,330.78

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 220 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 111742 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 3 SS PROVISIONALES 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Instalación Y Suministro de 3 SS Provisionales en la Escuela Primaria Acción terminada. Ignacio Zaragoza ubicada en la localidad de San Bartolomé (San Bartolo), Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

San Bartolomé (San Bartolo), Villa Localización:

Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,300,000.00

Ejercido 2019: \$1,300,000.00

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 221 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS MIGUEL HIDALGO 112518 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Edificios y Obra Exterior en el Jardín de Niños Miguel Acción terminada. Hidalgo ubicado en la localidad de Progreso Hidalgo, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Progreso Hidalgo, Villa Guerrero,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$74,656.18

Ejercido 2019: \$72,799.60

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante y rehabilitación de sanitarios.



FICHA 222 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 112502 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en el Jardín de Niños Sor Juana Inés Acción terminada. de la Cruz ubicado en Santiago Oxtotitlán, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 120 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Santiago Oxtotitlán, Villa Guerrero,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$293,875.49


Ejercido 2019: \$291,717.89

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.

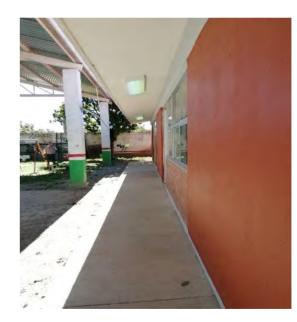

FICHA 223 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 112222 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda Etapa de la Rehabilitación en la Escuela Primaria Venustiano Obra en proceso. Carranza ubicada en Cruz Vidriada, Villa Guerrero, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Cruz Vidriada, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$31,281.73

Ejercido 2019: \$30,388.52

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 04/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 224 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS CELESTINA VARGAS BERVERA 111287 REHABILITACIÓN DE MUROS Y CIMENTACIÓN DE PISOS 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Muros y Cimentación de Pisos en el Jardín de Niños Obra en proceso. Celestina Vargas Bervera ubicado en Jesús María, Malinalco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 23 estudiantes.

PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL

DESARROLLO.

Localización: Jesús María, Malinalco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,367,044.12

Ejercido 2019: \$2,366,244.12

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 23/06/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de Muros y Cimentación de Pisos.



FICHA 225 **IMIFE**

JARDIN DE NINOS LUZ MARÍA GÓNGORA MILLÁN 111403 REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de 2 Aulas y Obra Exterior del Jardín de Niños Luz Obra en proceso. María Góngora Millán ubicado en la localidad de Santiago Tianguistenco de Galeana, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 68 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Santiago Tianguistenco de Galeana, Localización:

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$,190,430.72

Ejercido 2019: \$1,188,525.65

Fecha de Inicio: 28/05/2019

Fecha de Terminación: 26/07/2019

DATOS TÉCNICOS:

Reforzamiento en 3 espacios aulas, colocación de loseta cerámica, aplanados en muros y plafón, aplicación de pintura vinílica en muros interiores y exteriores,



FICHA 226 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LAFRAGUA 112294 REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín de Niños José María Lafragu en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$657,535.69

Ejercido 2019: \$657,739.79

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de rehabilitación, pintura y aplanados.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 227 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS GENERAL EMILIANO ZAPATA 112482 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D, COSTRUCCIÓN DE 100 ML DE BARDA 020501010102

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín De Niños General Emiliano Zapata Acción terminada.

en el Municipio de Ecatzingo Estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatzingo de Hidalgo

Costo de la Obra en 2019: \$124,734.78

Ejercido 2019: \$124,890.88

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación De Edificios A, B, C Y D, Construcción De 100 MI De Barda.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 228 **IMIFE**

JARDIN DE NIÑOS EZEQUIEL A. CHÁVEZ 112519 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010102

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Jardín de Niños Ezequiel A. Chávez en el Acción terminada.

Municipio de Atlautla Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: San Juan Tepecoculco

Costo de la Obra en 2019: \$94,895.61

Ejercido 2019: \$94,469.46

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Primer etapa de rehabilitación.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 200 alumnos.



FICHA 229 IMIFE

PRIMARIA "CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO" 114386-160 SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

Sustitución de 4 aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Centenario del Ejército Mexicano", ubicada en Carretera Tejupilco Río de Aquiagua Kilómetro 12, Río Aquiagua, Municipio de Tejupilco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Carretera Tejupilco Río de Aquiagua

Municipio Tejupilco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,298,290.55

Ejercido 2019: \$2,994,169.46

Fecha de Inicio: 12/08/2019

Fecha de Terminación: 09/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se sustituyó en estructura regional, plaza cívica, andadores, impermeabilización, loseta, pintura, cancelería, red eléctrica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 200 alumnos.



FICHA 230 IMIFE

PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" 114386-068 SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de 2 aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tejupilco, México.

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 100 alumnos

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ojo de Agua, Municipio de Tejupilco,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,498,338.55

Ejercido 2019: \$1,495,566.00

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se demolieron las 2 aulas y se reconstruyeron colocando firme de concreto, tabique rojo recocido para elaboración muros; castillos y trabes de concreto y losa de concreto armado.



FICHA 231

PRIMARIA "IGNACIO RAMÍREZ" 114386-222 SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Sustitución de 3 aulas, módulo de sanitarios y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en San Mateo, Municipio de Amanalco, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 311 alumnos

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: San Mateo, Municipio de Amanalco,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,998,671.17

Ejercido 2019: \$2,346,597.23

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación de zapatas corridas de concreto armado $F^1C=250~Kg/cm^2$, con muros carga de tabique rojo con castillos de concreto armados, loza de concreto $F^1C=250~Kg/cm^2$ armados con acero de refuerzo con impermeabilización prefabricada SBS de 4.0 mm de espesor con piso de loseta, cerámica, ventanas de aluminio y pintura en plafón y muros interior y exteriores, construcción de núcleo de servicios sanitarios para hombres y mujeres, construcción de cisterna y andadores.



I IOI IA Z

FICHA 232 **IMIFF**

PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"

114386-357 REHABILITACIÓN DE APLANADO EN BARDA PERIMETRAL 30 ML. REHABILITACIÓN DE MURO CABECERA EN EDIFICIO "A" 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación de aplanado en barda perimetral 30 ml. Rehabilitación Acción terminada. de muro cabecero en edificio "A", en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Los Saucos, Municipio de Valle de Bravo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

TRABAJOS EJECUTADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 177 alumnos

Fondo de Aportaciones Múltiples PROGRAMA:

Localización: Los Saucos, Municipio de Valle de Bravo,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$78,000.00

Ejercido 2019: \$77,127.96

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 02/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de aplanados existentes, reparación de castillo armado existente, colocación de aplanados y pintura en la barda perimetral.



FICHA 233 IMIFF

PRIMARIA "ALFREDO DEL MAZO" 114386-067 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN GENERAL 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Segunda etapa de rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo", ubicada en La Calera 101, Raíces, Municipio de Zinacantepec, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: La Calera 101, Raíces, Municipio de

Zinacantepec, México.

Costo de la Obra en 2019: \$500,000.00

Ejercido 2019: \$497,671.62

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro y colocación de impermeabilizante, re nivelación de losa con entortado de mortero, cemento, arena, colocación de impermeabilizante prefabricado en rollo color terracota; rehabilitación de sanitarios, retiro y colocación de lamben cerámico en muros, pintura interior en muros y plafón.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 102 alumnos.



FICHA 234 IMIFE

PRIMARIA "REDENCIÓN CAMPENSINA" 114386-232 REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación y obra exterior, en la Escuela Primaria "Redención Campesina", ubicada en Carretera Municipal Libre de Almoloya de Alquisiras a la Unión Riva Palacio Km. 13, La Unión Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Carretera Municipal Libre de Almoloya de

Alquisiras a la Unión Riva Palacio Km.

13,

La Unión Riva Palacio, Municipio de

Almoloya de Alquisiras, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,849,704.54

Ejercido 2019: \$1,849,700.49

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de 6 aulas, demolición de muros de tabique y se sustituyeron con tabique aparente, cancelería y puertas, aplanados, pintura en estructura, muros y construcción de plaza cívica, posteriormente se impermeabilizo.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 66 alumnos



IMIFE

PRIMARIA "CARLOS HANK GONZÁLEZ"

114386-365 SUSTITUCIÓN DE AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de aulas en estructura regional, salón de usos múltiples y obra exterior, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada en Tejupilco, Municipio de Tejupilco, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM)

Localización: Tejupilco, Municipio de Tejupilco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,899,353.38

Ejercido 2019: \$2,888,296.83

Fecha de Inicio: 14/10/2019

Fecha de Terminación: 22/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 4 aulas tipo regional, una dirección con sanitarios y un salón de usos múltiples.



FICHA 235

FICHA 236 IMIFE

PRIMARIA "HIMNO NACIONAL" 114386-207 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de rehabilitación, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Morelos y Venustiano Carranza S/N, Municipio de Coatepec Harinas, México

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Morelos y Venustiano Carranza S/N,

Municipio de Coatepec Harinas, México

Costo de la Obra en 2019: \$170,000.00

Ejercido 2019: \$165,615.19

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de auditorio, biblioteca y reforzamiento de aula, rehabilitación de aplanados.



FICHA 237 IMIFF

PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO, GT-5650 114386-155 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de Techumbre, en la Escuela Primaria Alfredo del Mazo, GT-5660; ubicada a 10 metro al Sur de campo deportivo, municipio de Temascalcingo, México.

Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 alumnos.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: 10 metro al Sur de campo deportivo,

Temascalcingo.

Costo de la Obra en 2019: \$1,499,496.60

Ejercido 2019: \$1,484,542.70

Fecha de Inicio: 30/09/2019

Fecha de Terminación: 28/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Ejecución a la fecha los trabajos de cimentación y montaje de piezas de acero de la estructura para la techumbre.



FICHA 238 **MIFE**

PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS 114386-227 REHABILITACIÓN GENERAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación General, en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas; ubicada en Calle a 1 Metro al oriente de la escuela Telesecundaria. domicilio Conocido, Sanacohe Ejido, Municipio de San Felipe del BENEFICIOS GENERADOS Progreso, México.

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples PROGRAMA:

Localización: Calle a 1 Metro al oriente de la Escuela

> Telesecundaria, domicilio Conocido, Sanacoche Ejido, San Felipe del

Progreso.

Costo de la Obra en 2019: \$2,499,670.96

Ejercido 2019: \$2,498,583.06

03/09/2019 Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de impermeabilizante en losa, aplicación de pintura en muros, colocación de loseta y obra exterior.

Obra en proceso.

Aproximadamente 100 alumnos.



FICHA 239 **IMIFF**

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA

114386-343 SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN 6 AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS MISMAS. SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES **AFECTADOS** 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de losas en 6 aulas y Rehabilitación general de las Obra en proceso. mismas, Sustitución de plaza cívica y andadores afectados, en la Escuela primaria Ignacio Zaragoza; ubicada a un lado del Auditorio, San Juan Daxthi, Municipio de Soyaniquilpan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 300 alumnos.

DATOS GENERALES

Fondo de aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: A un lado del Auditorio, San Juan

Daxthi, Soyaniquilpan.

Costo de la Obra en 2019: \$1147,900.14

Ejercido 2019: \$1,964,710.05

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y sustitución de las losas, cimbrado y armado de acero en losas de aulas.



FICHA 240 SIGLAS

PRIMARIA CARLOS M. SALCEDO 114298-06 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra complementaria para la impermeabilización en la Primaria Carlos M. Salcedo, San Buenaventura, Toluca, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 1238 Alumnos

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: San Buenaventura, Toluca, México.

Costo de la Obra en 2019: \$169,054.01

Ejercido 2019: \$50,716.20

Fecha de Inicio: 22/02/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro de impermeabilizante e impermeabilización del Edificio "A"



FICHA 241 **IMIFF**

PRIMARIA EMILIO PORTES GIL

114386-034 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TALLER DE CÓMPUTO 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de Acción terminada. taller de cómputo en la Primaria Emilio Portes Gil, San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 292 estudiantes.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac, Localización:

México.

Costo de la Obra en 2019: \$770,000.00

Ejercido 2019: \$769,344.89

Fecha de Inicio: 22/02/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de sanitarios (aplanados, pisos, pintura, instalación eléctrica, muebles sanitarios, cancelería, puertas), impermeabilización general, construcción de cubo de tinacos, rehabilitación y automatización de cisterna existente



FICHA 242 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 114386-063 DESMANTELAMIENTO DE 6 AULAS PROVISIONALES 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Desmantelamiento de 6 aulas provisionales en la Escuela Primaria Acción terminada. Vicente Guerrero ubicada en Durango No. 50, El Chamizal, Ocuilan,

México.

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Durango No. 50, El Chamizal, Ocuilan,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,344,735.03

Ejercido 2019: \$1,340,077.31

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

DATOS GENERALES

Desmontaje de aulas provisionales (estructura metálica y multipanel), traslado y armado en el lugar asignado



FICHA 243 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 114386-202 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de rehabilitación de la Escuela Primaria Justo Sierra Obra en proceso. ubicada en Junto a la Iglesia, Malinalco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Junto a la Iglesia, Malinalco, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$134,783.08

Ejercido 2019: \$123,885.60

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de la rehabilitación de edificios, sustitución de lámparas en interior y exterior de edificios.



FICHA 244 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA L HENRY FORD NO. 25 114386-353 SUSTITUCIÓN DE 40M DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de 40m de barda perimetral de la Escuela Primaria L Obra en proceso. Henry Ford No. 25 ubicada en la localidad de Mina y Morelos No. 5, Santa Ma. Magdalena Ocotitlán, Metepec, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 115 estudiantes.

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Mina y Morelos No. 5, Santa Ma.

Magdalena Ocotitlán, Metepec, México.

Costo de la Obra en 2019: \$300,000.00

Ejercido 2019: \$298,825.64

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 01/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de barda perimetral existente, construcción de barda perimetral.



FICHA 245 IMIFE

PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO 114386-154 SUSTITUCIÓN DE 12 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y MÓDULO DE ESCALERAS 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de 12 aulas, módulo de sanitarios y módulo de escaleras, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en cd. López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 346 alumnos.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Cd. López Mateos, Municipio de Atizapán

de Zaragoza, México.

Costo de la Obra en 2019: \$14,600,000.00

Ejercido 2019: \$8,624,700.65

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Habilitado de acero para cajón de cimentación, así como la cimbra.



FICHA 246 IMIFE

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 114386-281 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 20501010103

ANTECEDENTES

Terminación de rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera a Jiquipilco, La Cañada, Municipio de Temoaya, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Carretera a Jiquipilco, La Cañada,

Municipio de Temoaya, México

Costo de la Obra en 2019: \$1,696,763.00

Ejercido 2019: \$1,692,459.89

Fecha de Inicio: 04/08/2019

Fecha de Terminación: 22/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro y colocación de azulejo y piso en sanitarios, cubo de tinacos nuevos, suministro y colocación de loseta cerámica en aulas, demolición de plaza cívica y firme de concreto en plaza cívica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 213 alumnos



FICHA 247 IMIFE

PRIMARIA IGNACIO JOSÉ ALLENDE 114386-282 TERMINACIÓN DE AULAS U-2C, TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL 0205010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de aulas U-2C, techumbre y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio José de Allende", ubicada en Ignacio Allende Núm. 1, Enthavi, Municipio de Temoaya, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Acción en proceso.

DATOS GENERALES Aproximadamente 242 alumnos

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ignacio Allende Núm. 1, Enthavi,

Municipio de Temoaya, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,000,000.00

Ejercido 2019: \$1,442,060.94

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Impermeabilización de dos edificios, pintura exterior e interior en edificios, pintura en barandal y herrería.



FICHA 248 IMIFE

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 114386-314 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Calle Parque Anáhuac No. 1, Municipio de Temoaya, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Calle Parque Anáhuac No. 1, Municipio

de Temoaya, México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,497,567.47

Ejercido 2019: \$3,488,484.54

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación integral de módulo de sanitarios, red eléctrica, retiro de cancelería existente, suministro y colocación de cancelería de aluminio en ventanas y puertas, cisterna 10m³ nueva, pintura en muros y trabes, plafón, suministro y colocación de lámparas.

Acción en proceso

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 991 alumnos



FICHA 249 IMIFE

PRIMARIA WENCESLAO LABRA 114386-375 REHABILITACIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL 0205010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de red pluvial, en Escuela Primaria "Wenceslao Labra", ubicada en Fraccionamiento Habitacional La Joya Chica, Municipio de Tlalnepantla.

BENEFICIOS GENERADOS

Acción por iniciar.

DATOS GENERALES Aproximadamente 306 alumnos

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: en Fraccionamiento Habitacional La Joya

Chica, Municipio de Tlalnepantla.

Costo de la Obra en 2019: \$714,296.88

Ejercido 2019: \$214,289.06

Fecha de Inicio: 08/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Aplanados, instalación eléctrica, firmes de concreto y pintura en muros.



FICHA 250 IMIFE

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 114386-258 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de muro de contención y barda perimetral, en Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Enthavi, municipio de Temoaya.

Acción por iniciar

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Enthavi, Municipio de Temoaya.

Costo de la Obra en 2019: \$1,489,346.75

Ejercido 2019: \$1,488,354.04

Fecha de Inicio: 3008/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral.

Aproximadamente 92 alumnos



FICHA 251 **IMIFF**

PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA 114386-158 CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE 260 ML DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de 7 aulas y módulos sanitarios, sustitución de 260 ml Acción en proceso de barda perimetral en la Escuela Primaria "Héroes de la Independencia", ubicada en Calle Lago de Zallatlán s/n, Municipio de Tlalnepantla, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Calle Lago de Zallatlán s/n, Municipio de

Tlalnepantla, México.

Costo de la Obra en 2019: \$6,197,848.88

Ejercido 2019: \$6,119,267.81

Fecha de Inicio: 04/09/2019

Fecha de Terminación: 22/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de espacios, aula, colocación de aulas prefabricadas.



FICHA 252 **IMIFE**

PRIMARIA LIC. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 114386-348 REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en Calle Prolongación San Miguel s/n, Col. Lomas de San Agustín, Municipio de Naucalpan, México.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Calle Prolongación San Miguel s/n, Col. Localización:

Lomas de San Agustín, Municipio de Naucalpan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$195,000.00

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Terminación: 16/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

DATOS GENERALES

Retiro de 3 aulas de lámina, construcción de tres espacios aula.



BENEFICIOS GENERADOS

Acción por iniciar.

FICHA 253 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA 114386-164 SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de 2 aulas, barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y Obra en proceso. obra exterior en la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra en la comunidad de Potrero de la Sierra, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 50 estudiantes.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Potrero de la Sierra, Villa Guerrero,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,995,058.68

Ejercido 2019: \$2,509,197.03

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 254 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 114386-023 2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS C Y H EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

2da etapa de rehabilitación de los edificios C y H en estructura U-1C Acción terminada. y obra exterior en la Escuela primaria Emiliano Zapata ubicada en la comunidad de Emiliano Zapata, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 320 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Emiliano Zapata, Tenancingo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,073,706.08

Ejercido 2019: \$,051,761.31

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 255 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 114386-059 SUSTITUCIÓN DE AULAS 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de aulas en la Escuela Primaria Emiliano Zapata ubicada Acción terminada. en la Calle Francisco I. Madero S/n, Ahuatenco, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Calle Francisco I. Madero S/n,

Ahuatenco, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,038,318.04

Ejercido 2019: \$,1036,875.83

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 01/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de todo el plantel.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 98 estudiantes.



FICHA 256 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 114386-048 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de plantel en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Acción terminada. Cruz en la comunidad de Santiago Oxtotitlán, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 160 estudiantes.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Santiago Oxtotitlán, Villa Guerrero,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$400,000.00

Ejercido 2019: \$399,836.02

Fecha de Inicio: 05/07/2019

Fecha de Terminación: 03/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 257 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 114386-201 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA. IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y Obra en proceso. rehabilitación de aulas de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta ubicada en Francisco Javier Mina S/N, Tianquistenco, BENEFICIOS GENERADOS México.

Aproximadamente 40 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Francisco Javier Mina S/N.

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,738,457.15

Ejercido 2019: \$2,731,369.42

Fecha de Inicio: 23/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula estructura regional, rehabilitación de 8 aulas (desmantelamiento de cancelería, loseta, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización), demolición y construcción de plaza cívica, construcción de cisterna y rehabilitación de sanitarios, aplanados y pintura en barda perimetral, rehabilitación de instalación eléctrica interior y exterior.



FICHA 258 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD 114386-330 TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE TOTAL DE AULAS A, B Y C 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de reconstrucción de total de aulas A, B y C de la Obra en proceso. Escuela Primaria Libertad en la localidad de Tlatempa, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

BEIVELIOIGO GELVELVIDOG

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Tlatempa, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,845,385.22

Ejercido 2019: \$1,841,768.34

Fecha de Inicio: 14/10/2019

Fecha de Terminación: 22/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de aula de usos múltiples y sanitarios.



FICHA 259 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 114386-332 RECONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reconstrucción de salón de usos múltiples y obra exterior de la Obra en proceso. Escuela Primaria Miguel Hidalgo ubicada en la comunidad de Amola (San Isidro Amola), Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 128 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Amola (San Isidro Amola), Ocuilan,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,099,222.79

Ejercido 2019: \$1,075,379.51

Fecha de Inicio: 14/10/2019

Fecha de Terminación: 22/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula y rehabilitación de pintura exterior.



FICHA 260 IMIFE

PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL 114386-161 CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO Y ESCALERA Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Nezahualcóyotl Municipio De Acción en proceso

Cuautitlán Izcalli Estado De México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$2,493,067.05

Ejercido 2019: \$747,920.11

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se Demolieron Aproximadamente 120 M2 De Piso Para Hacer Trazo Y Nivelación De Cimentación E Iniciar Los Trabajos De Nivelación De Piso.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 261 **IMIFE**

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN 114386-044 TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Ricardo Flores Magón en el Acción en proceso. Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$131,889.00

Ejercido 2019: \$126,556.89

Fecha de Inicio: 05/07/2019

Fecha de Terminación: 03/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de Rehabilitación de 5 Aulas, Aplanados, Pintura e Impermeabilización.



FICHA 262 IMIFE

PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 114386-065 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Tierra y Libertad en el Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de aportaciones múltiples

Localización: Chiconautla 3000, Barrio 2

Costo de la Obra en 2019: \$72,000.00

Ejercido 2019: \$69,426.00

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 24/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de aplanados, pintura, cancelería de aluminio e Impermeabilización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 263 IMIFE

PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ 114386-038 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Graciano Sánchez en el Municipio Acción terminada.

de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples 2019

Localización: Colonia Almarcigo Norte

Costo de la Obra en 2019: \$260,000.00

Ejercido 2019: \$258,175.00

Fecha de Inicio: 08/10/2019

Fecha de Terminación: 06/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de Sustitución de Cancelería, Aplanados de Barda Perimetral, Pintura.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 264 **IMIFE**

PRIMARIA 24 DE FEBRERO 114386-040 TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria 24 De Febrero en el Municipio De Acción terminada.

Ecatepec Estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Fuentes de San Cristóbal

Costo de la Obra en 2019: \$265,000.00

Ejercido 2019: \$261,823.45

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos De Aplanados, Pintura, Cancelería de Aluminio, Impermeabilización.

BENEFICIOS GENERADOS

FICHA 265 **IMIFE**

PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 114386-221 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Sebastián Lerdo de Tejada en el Acción terminada. Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Avenida San Felipe s/n

Costo de la Obra en 2019: \$3,195,914.91

Ejercido 2019: \$3,187,505.20

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral



FICHA 266 **IMIFE**

PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA 114386-223 BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana En El Acción en proceso.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Avenida Sur 7 No. 24

Costo de la Obra en 2019: \$2,814,057.42

Ejercido 2019: \$ 2,805,684.04

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Barda Perimetral.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 267 IMIFE

PRIMARIA LICENCIADO. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 114386-224 REHABILITACION DEL PLANTEL Y SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Licenciado. Adolfo López Mateos

en el Municipio de Ecatepec

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Avenida Santa Prisca Norte s/n

Costo de la Obra en 2019: \$2,797,863.66

Ejercido 2019: \$2,789,245.51

Fecha de Inicio: 04/09/2019

Fecha de Terminación: 22/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación del plantel y sustitución de barda perimetral.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 268 IMIFE

PRIMARIA BENÉMERITO DE LAS AMÉRICAS 114386-240 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Benemérito De Las Américas en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Avenida Simón Bolívar S/N,

Costo de la Obra en 2019: \$433,000.00

Ejercido 2019: \$425,441.58

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de Impermeabilización de 4 Aulas, loseta en pisos y aplanados y pintura en barda perimetral

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 269 **IMIFE**

PRIMARIA LICENCIADO ISIDRO FABELA ALFARO 114386-243 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Licenciado Isidro Fabela Alfaro en Acción terminada.

el Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$300,000.00

Ejercido 2019: \$288,846.20

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cambio de instalación hidráulica, cambio e muebles sanitarios y mamparas

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 270 IMIFE

PRIMARIA RUBÉN DARÍO 114386-254 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (CO) 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Rubén Darío en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Calle Orquideas S/N

Costo de la Obra en 2019: \$1,994,080.36

Ejercido 2019: \$1,986,586.2

Fecha de Inicio: 17/09/2019

Fecha de Terminación: 25/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda Perimetral.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 271 IMIFE

PRIMARIA NIÑOS HÉROES 114386-256 PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (CO) 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Niños Héroes en el Municipio de Acción en proceso.

Ecatepec

BENEFICIOS GENERADOS
DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Calle Urraca

Costo de la Obra en 2019: \$1,768,372.9

Ejercido 2019: \$1,766,894.14

Fecha de Inicio: 17/09/2019

Fecha de Terminación: 25/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Primer etapa para la construcción de barda perimetral.



FICHA 272 IMIFE

PRIMARIA OTILIO MONTAÑO 114386-283 RECONSTRUCCIÓN DE PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Otilio Montaño en el Municipio de Acolman Acción terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Aproximadamente 400 alumnos.

Localización: San Martín Azcatepec

Costo de la Obra en 2019: \$3,495,602.84

Ejercido 2019: \$3,492,835.55

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un Edificio de 2 Niveles, 8 Aulas, Cubo De Escaleras, Plaza Cívica e Iluminación De Exterior.



FICHA 273 **IMIFE**

PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 114386-309 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón en el Acción terminada.

Municipio de Tonanitla estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Santa María Tonanitla Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$959,712.13

Ejercido 2019: \$851,931.78


Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de 3 aulas y pórtico.

BENEFICIOS GENERADOS

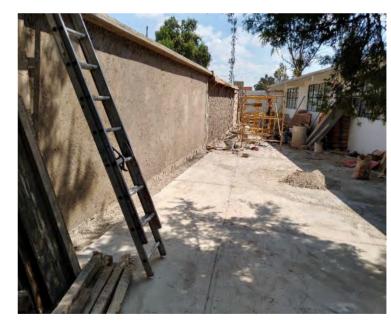

FICHA 274 MIFE

PRIMARIA VICENTE GUERRERO 114386-011 SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS Y PÓRTICO 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Primaria Vicente Guerrero en el Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$2,799,602.36

Ejercido 2019: \$2,787,748.45

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de 3 aulas y pórtico

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Acción terminada.



FICHA 275 IMIFE

PRIMARIA REY XOLOX 114386-058 MANTENIMIENTO 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Primaria Rey Xolox en el Municipio de

Tecámac

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Calle Argentina, San Lucas

Costo de la Obra en 2019: \$80,000.66

Ejercido 2019: \$79,672.55

Fecha de Inicio: 05/07/2019

Fecha de Terminación: 03/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro de impermeabilizante existente y colocación de imper nuevo.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 276 IMIFE

PRIMARIA JUSTO SIERRA 114386-360 COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN CINCO AULAS 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Primaria Justo Sierra En El Municipio De

Otumba

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Plaza Principal s/n, San Miguel Xolco

Costo de la Obra en 2019: \$175,000.00

Ejercido 2019: \$ 173,850.86

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 01/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de loseta cerámica y aplicación de pintura general en cinco aulas.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Acción terminada.



FICHA 277 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 114386-217 SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y 69.39 ML DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda Acción terminada. perimetral en la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez ubicada en Chalchihuapan, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Chalchihuapan, Tenancingo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$4,269,084.22

Ejercido 2019: \$3,816,465.05

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Firme de concreto en plaza cívica



FICHA 278 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 114386-200 SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS, REHABILITACIÓN DE 3 AULAS Y OBRAS EXTERIORES 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de 3 aulas, rehabilitación de 3 aulas y obras exteriores de Obra en proceso. la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano ubicada en la localidad de Independencia, Tepalcatepec, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 80 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Independencia, Tepalcatepec,

Tenancingo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,743,524.8

Ejercido 2019: \$2,733,831.91

Fecha de Inicio: 23/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 279 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 114386-335 SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN GENERAL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de reconstrucción de barda y rehabilitación general de Obra en proceso. la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza ubicada Junto al Jardín de Niños, Guadalupe Ahuacatlán, Zumpahuacan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 70 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Junto al Jardín de Niños, Guadalupe

Ahuacatlán, Zumpahuacan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$320.000.00

Ejercido 2019: \$316,368.25

Fecha de Inicio: 12/08/2019

Fecha de Terminación: 09/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de barda y obra exterior.



FICHA 280 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR 114386-336 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE 6 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE 25 ML DE BARDA 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas y sustitución de 25 ml de Obra en proceso. barda en la Escuela Primaria Agustín Melgar ubicada en J. Sierra, Quetzalapa, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

J. Sierra, Quetzalapa, Tenancingo, Localización:

México.

Costo de la Obra en 2019: \$315,000.00

Ejercido 2019: \$311,407.61

Fecha de Inicio: 12/08/2019

Fecha de Terminación: 09/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Zapata y contratrabes de concreto armado, muro de tabique rojo recocido y acabado de pintura.



FICHA 281 IMIFE

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 115670-026 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, MANTENIMIENTO A MÓDULOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En El Municipio Acción terminada.

De Otumba Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Oxtotipac

Costo de la Obra en 2019: \$700,000.00

Ejercido 2019: \$698,588.45

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación del plantel, mantenimiento a módulos sanitarios e impermeabilización

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 282 IMIFE

PRIMARIA AMADO NERVO 114386-384 ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 020501010103

BENEFICIOS GENERADOS

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Amado Nervo en el Municipio De Acción terminada.

Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Avenida Pino s/n, La Presa Tulpetlac

Costo de la Obra en 2019: \$1,536,952.93

Ejercido 2019: \$1,536,407.91

Fecha de Inicio: 06/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Electrificación en media tensión con subestación eléctrica.



FICHA 283 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

114386-324 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE 6 AULAS, 1 DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRAS EXTERIORES 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción Obra en proceso. de 2 aulas y obras exteriores de la Escuela Primaria Niños Héroes ubicada en Ixpuichiapan, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 160 estudiantes.

Fondo de Aportaciones Múltiples. Ixpuichiapan, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,528,512.37

Ejercido 2019:

PROGRAMA:

Localización:

\$ 2,528,512.37

Fecha de Inicio:

30/09/2019

Fecha de Terminación:

28/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de trabes y columnas de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 284 **IMIFE**

PRIMARIA CUAUHTÉMOC 115670-019 SUSTITUCIÓN DE SALA DE CÓMPUTO, COMEDOR Y AULA DE DANZA 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Cuauhtémoc En El Municipio De Acción terminada.

Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$280,000.00

Ejercido 2019: \$280,000.00

Fecha de Inicio: 04/11/2019

Fecha de Terminación: 19/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de sala de cómputo, comedor y aula de danza

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 285 IMIFE

PRIMARIA DIEGO RIVERA 115670-020 SUSTITUCIÓN DE COMEDOR, TALLER DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Diego Rivera En El Municipio De Acción terminada.

Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$180,000.00

Ejercido 2019: \$180,000.00

Fecha de Inicio: 04/11/2019

Fecha de Terminación: 19/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de comedor, taller de cómputo y administración.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 286 IMIFE

PRIMARIA CASA DE MORELOS 114386-295 REHABILITACIÓN DE PLANTEL (CO) 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Casa de Morelos en el Municipio Acción terminada.

de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$118,616.06

Ejercido 2019: \$118,616.06

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 24/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de Aplanados, Cambio de Cancelería de Aluminio, Cambio De Instalación Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 287 IMIFE

PRIMARIA "JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA" 111829 REHABILITACIÓN 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Joaquín Arcadio Pagaza", Acción en proceso. ubicada en Valle de Bravo, Municipal Valle de Bravo, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Valle de Bravo, Municipal Valle de Bravo,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$100,773.23

Ejercido 2019: \$99,760.55

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Restauración de muros, aplanados, cambio de iluminarias, contactos, rehabilitación de explanada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 955 alumnos



FICHA 288 **IMIFE**

PRIMARIA N° 2140 "5 DE MAYO" 112118 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria N° 2140 "5 de Acción por iniciar. mayo", ubicada en Colorines, Municipio de Valle de bravo, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Colorines, Municipio de Valle de bravo,

México

Costo de la Obra en 2019: \$106,330.49

Ejercido 2019: \$100,517.03

Fecha de Inicio: 28/09/2019

Fecha de Terminación: 11/11/20119

DATOS TÉCNICOS:

Se realizó visita al plantel y aun no se han realizado trabajos.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 383 alumnos



FICHA 289 IMIFE

PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" 112293 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Mamatla, Municipio de Zacualpan, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Mamatla, Municipio de Zacualpan,

México

Costo de la Obra en 2019: \$92,326.22

Ejercido 2019: \$85,761.20

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se colocó impermeabilizante, pintura en plafón y luminarias.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 61 alumnos



FICHA 290 **IMIFE**

PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 112257 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada Acción por iniciar. en Santa María, Municipio de Tlatlaya, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Santa María, Municipio de Tlatlaya,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,177,410.01

Ejercido 2019: \$2,172,698.00

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de techumbre, restauración de grietas y pintura.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 102 alumnos



FICHA 291 **IMIFE**

PRIMARIA "ALFREDO ZARATE ALBARRÁN" 112250 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de rehabilitación, en la Escuela Primaria "Alfredo Acción terminada. Zarate Albarrán", ubicada en Temascaltepec de González, Municipio de Temascaltepec, México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el Desarrollo.

Temascaltepec de González, Municipio Localización:

de Temascaltepec, México

Costo de la Obra en 2019: \$62,623.66

Ejercido 2019: \$60,279.01

Fecha de Inicio: 17/08/ 2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de impermeabilizante.



FICHA 292 **IMIFE**

PRIMARIA "FRANCISCO JAVIER MINA" 111806 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Francisco Javier Mina", Acción terminada ubicada en La Cofradía, Municipio de Amatepec, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: La Cofradía, Municipio de Amatepec,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$250,000.00

Ejercido 2019: \$247,186.42.

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 05/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula tipo regional con tabique, cancelería y puertas, aplanados, pintura en estructura.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 50 alumnos



FICHA 293 **IMIFE**

PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 112263 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada Acción terminada.

en Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya,

México

Costo de la Obra en 2019: \$62,040.78

Ejercido 2019: \$60,347.18

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 9 módulos de barda perimetral e impermeabilizante.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 34 alumnos



FICHA 294 IMIFE

PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" 112311 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, México

Costo de la Obra en 2019: \$500,000.00

Ejercido 2019: \$496299.60

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de dos aulas tipo regional, tabique, cancelería, pintura.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 alumnos



FICHA 295 IMIFF

PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" 112308 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Quimicha tenco (Barranca de Quimicha tenco), Municipio de Amatepec, México

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 200 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Quimicha tenco (Barranca de Quimicha

tenco), Municipio de Amatepec, México

Costo de la Obra en 2019: \$149,600.73

Ejercido 2019: \$147,907.12

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de cuatro aulas tipo regional, instalación eléctrica, pintura e impermeabilizante.



FICHA 296 IMIFE

PRIMARIA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" 111794 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Ramón López Velarde", Acción en proceso. ubicada en Rincón de López, Municipio de Tejupilco, México

BENEFICIOS GENERADOS DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Rincón de López, Municipio de Tejupilco,

México

Costo de la Obra en 2019: \$124,803.85

Ejercido 2019: \$122,759.93

Fecha de Inicio: 03/08/ 2019

Fecha de Terminación: 31/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral y pintura.



FICHA 297 **IMIFE**

PRIMARIA "IGNACIO LÓPEZ RAYÓN" 112326 REHABILITACIÓN 020501010103

BENEFICIOS GENERADOS

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada Acción Terminada

en Los Encinos, Municipio de Amatepec, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Los Encinos, Municipio de Amatepec, Localización:

México

Costo de la Obra en 2019: \$81,287.63

Ejercido 2019: \$81,107.06

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 05/09/ 2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación, colocación de impermeabilizante, pintura. Instalación eléctrica. Construcción de barda perimetral.



FICHA 298 **IMIFE**

PRIMARIA "CUAUHTEMOC" 112327 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Acción en proceso. Salitre Santa Barbara, Municipio de Amatepec, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Salitre Santa Barbara, Municipio de

Amatepec, México

Costo de la Obra en 2019: \$66,747.95

Ejercido 2019: \$64,525.16

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 05/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula tipo regional, instalación eléctrica, pintura e impermeabilizante.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 29 alumnos



FICHA 299 **IMIFE**

PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" 112325 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", Acción en proceso.

ubicada en El Puerto, Municipio de Amatepec, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

El Puerto, Municipio de Amatepec, Localización:

México

Costo de la Obra en 2019: \$269,394.04

Ejercido 2019: \$266,618.74

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 21/01/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula, aplanado, pintura, piso loseta, instalación eléctrica, plaza cívica e impermeabilizante.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 50 alumnos



FICHA 300 **IMIFE**

PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" 112310 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Acción en proceso.

Los Timbres, Municipio de Amatepec, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Los Timbres, Municipio de Amatepec,

México

Costo de la Obra en 2019: \$1,038,364.38

Ejercido 2019: \$1,031,404.37

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de impermeabilizante.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 29 alumnos



FICHA 301 **IMIFE**

PRIMARIA "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN" 111984 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarrán", Acción terminada. ubicada en San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec, México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 1542 alumnos

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

San Miguel Zinacantepec, Municipio de Localización:

Zinacantepec, México

Costo de la Obra en 2019: \$104,309.27

Ejercido 2019: \$101,734.06

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de malla electro soldada en piso de concreto, colado de castillos.



FICHA 302 **IMIFE**

PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" 112242 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Acción en terminada

Paso del Agua, Municipio de Luvianos, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Paso del Agua, Municipio de Luvianos,

México

Costo de la Obra en 2019: \$85,355.35

Ejercido 2019: \$84,864.09

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de módulo sanitario.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 150 alumnos



FICHA 303 IMIFE

PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 112268 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec de Harinas, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Chiltepec de Hidalgo, Municipio de

Coatepec de Harinas, México

Costo de la Obra en 2019: \$35,395.93

Ejercido 2019: \$34,216.90

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral aplanados, pintura.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 160 alumnos



FICHA 304 IMIFE

PRIMARIA "HIMNO NACIONAL" 112270 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Primera de Santa Ana, Municipio de Coatepec Harinas, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Primera de Santa Ana, Municipio de

Coatepec Harinas, México

Costo de la Obra en 2019: \$39,748.09

Ejercido 2019: \$39,199.98

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realizaron trabajos de limpieza de herrería y vidrios en ventanas y muros.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 324 alumnos



FICHA 305 IMIFE

PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" 112273 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Los Zacatones (San Felipe de Jesús), Municipio de Coatepec Harinas, México

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 200 alumnos

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Zacatones (San Felipe de Jesús),

Municipio de Coatepec Harinas, México

Costo de la Obra en 2019: \$39,373.75

Ejercido 2019: \$38,395.08

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de cuatro aulas tipo regional, instalación eléctrica, pintura en muros interior y exterior e impermeabilizante.



FICHA 306 **IMIFE**

PRIMARIA "CARLOS HANK GONZÁLEZ" 112332 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", Acción en proceso. ubicada en Ciprianes, Municipio de Luvianos, México

DATOS GENERALES

Localización:

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Ciprianes, Municipio de Luvianos, México

Costo de la Obra en 2019: \$184,364.36

Ejercido 2019: \$183,689.24

Fecha de Inicio: 21/08/2019

Fecha de Terminación: 18/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 2 aulas y barda perimetral, colocación de cancelería, impermeabilizante y pintura.



FICHA 307 **IMIFF**

PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" 111954 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruiz Cortinez", ubicada Acción terminada en El Salto, Municipio de Zacualpan, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

El Salto, Municipio de Zacualpan, México Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$37,285.00

Ejercido 2019: \$35,428.42

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realizaron los trabajos de rehabilitación exterior e interior de e impermeabilizante en un aula, muros, plafones y pisos rehabilitación de módulo sanitario y colado de pisos y andadores

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 23 alumnos



FICHA 308 IMIFE

PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" 111955 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Acción en proceso.

La Mora, Municipio de Zacualpan, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: La Mora, Municipio de Zacualpan, México

Costo de la Obra en 2019: \$37,248.85

Ejercido 2019: \$35,456.92

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Pintura, limpieza, impermeabilización.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente alumnos



FICHA 309 **IMIFE**

PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" 112246 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano",

ubicada en San Sebastián (Rincón de Sa n Sebastián), Municipio de Luvianos, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: San Sebastián (Rincón de San

Sebastián), Municipio de Luvianos,

México

Costo de la Obra en 2019: \$61,466.27

Ejercido 2019: \$60,521.05

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 22/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de losa, aplanados y pintura en aulas.

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 43 alumnos



FICHA 310 IMIFE

PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 112333 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en El Acción terminada. Capire, Municipio de Luvianos, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: El Capire, Municipio de Luvianos, México

Costo de la Obra en 2019: \$36,582.74

Ejercido 2019: \$35,693.59

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 22/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de losa, construcción de barda perimetral, colocación de pintura en muros y plafón.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 29 alumnos



FICHA 311 **IMIFF**

PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ 111827 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez; ubicada en Obra en Proceso. Jiquipilco, Municipio de Jiquipilco, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo

Jiquipilco, Jiquipilco. Localización:

Costo de la Obra en 2019 : \$100,857.92

Ejercido 2019: \$98,885.92

Fecha de Inicio: 10/08/ 2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de colocación de loseta en los pisos de los edificios A y B, aplicación de pintura en muros, zoclos, plafones y barandales.



FICHA 312 IMIFF

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 112129 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria Francisco I. Madero; ubicada en Primera manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiguipilco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: Primera Manzana de Santa Cruz

Tepexpan, Jiquipilco.

Costo de la Obra en 2019 : \$89,112.37

Ejercido 2019: \$85,399.21

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro y colocación de impermeabilizante en losa del edificio B, construcción de barda perimetral posterior al edificio A, demolición y construcción de firme existente y aplicación de pintura general en edificios A y B.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 118 alumnos.



FICHA 313 IMIFE

PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 112323 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria Tierra y Libertad; ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: San Felipe del Progreso,

San Felipe del Progreso.

Costo de la Obra en 2019 : \$29,187.53

Ejercido 2019: \$28,401.87

Fecha de Inicio: 25/07/ 2019

Fecha de Terminación: 22/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de sección de barda perimetral, refuerzo en cimentación y construcción con tabique rojo.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 alumnos.



FICHA 314 **IMIFE**

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 111773 REHABILITACIÓN 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Primaria Francisco I. Madero; ubicada Obra en proceso. en Chosto de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: Chosto de los Jarros, Atlacomulco.

Costo de la Obra en 2019: \$153,225.82

Ejercido 2019: \$150,448.72

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de un aula afectada y sustitución de la misma, con el remante se llevará a cabo trabajos de rehabilitación.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 50 alumnos.



FICHA 315 IMIFE

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 112136 REHABILITACIÓN 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación en la Primaria Miguel Hidalgo, Santa Lucía, Ocuilan,

México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Santa Lucía, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,268,149.26

Ejercido 2019: \$1,262.824.86

Fecha de Inicio: 03/08/ 2019

Fecha de Terminación: 30/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Estructura regional, zapatas corridas de concreto armado, enrases de block, muros de tabique rojo, cadenas, castillos, losa de concreto armado, muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, azulejo, mamparas de láminas, azulejo, lámparas y andadores.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 estudiantes



FICHA 316 IMIFE

PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 112334 TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE AULAS DAÑADAS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Reconstrucción de Aulas Dañadas en la Prim. Gral. Lázaro Cárdenas, Ocuilan de Arteaga, México.

Obra en proceso.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Aproximadamente 1250 estudiantes.

Localización: Ocuilan de Arteaga, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,789,524.61 Ejercido 2019: \$1,767,692.16

Fecha de Inicio: 04/09/ 2019

Fecha de Terminación: 02/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Estructura regional, zapatas corridas de concreto armado, enrases de block, muros de tabique rojo, cadenas, castillos, losa de concreto armado, muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, azulejo, mamparas de láminas, azulejo, lámparas y andadores. Estructura U-2C, zapatas corridas y contratrabes de concreto armado, muros de concreto, trabes, columnas y losa de concreto armado, muros divisorios de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, lámparas, andadores. Construcción de fosa séptica y cisterna



FICHA 317 IMIFE

PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 114161 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación del Plantel en la Primaria Lic. Adolfo López Mateos, El puente, Ocuilan, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 61 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: El puente, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$450,000.00

Ejercido 2019: \$448,085.99

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral, impermeabilización de losas, pintura en exteriores.



FICHA 318 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO 4 REHABILITACIÓN 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación de la escuela Primaria Leona Vicario, Pastoría (La Pastora), Ocuilan, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización:

PROGRAMA:

Pastoría (11222La Pastora), Ocuilan,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$141,702.55

Ejercido 2019: \$141,488.67

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de tres Aulas, acceso principal, aplanado de bardas y pintura.



FICHA 319 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 112229 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Las

Trojes, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Acción terminada.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Las Trojes, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$123,815.88

Ejercido 2019: \$123,558.36

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de construcción de 6 Aulas y servicios sanitarios.



FICHA 320 **IMIFE**

PRIMARIA EL CAPULÍN 114207 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación del Plantel Primaria El Capulín en El Capulín, Ocuilan, Obra en proceso.

México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 87 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

El Capulín, Ocuilan, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$450,000.00

Ejercido 2019: \$448,215.91

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de cerco perimetral, rehabilitación de instalación eléctrica, colocación de loseta cerámica en aula e impermeabilización



FICHA 321 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE GANTE 112120 SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de Barda Perimetral de la Escuela Primaria Pedro de Acción terminada. Gante en Toluca de Lerdo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 975 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Toluca de Lerdo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$62,788.36

Ejercido 2019: \$58,788.97

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y reconstrucción de tramo de barda perimetral sur.



FICHA 322 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 112121 REHABILITACIÓN DE AULAS 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas de la Escuela Primaria Melchor Ocampo en Acción terminada. Toluca de Lerdo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 228 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Toluca de Lerdo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$116,025.13

Ejercido 2019: \$111,876.62

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de loseta en aulas, firme e patio y andadores, aplanados y pintura en barda perimetral.



FICHA 323 IMIFE

PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 114135 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel en la Primaria Licenciado Benito Juárez de Obra con un avance del 80%

Tonatico, México.

BENEFICIOS GENERADOS DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Tonatico, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,000,000.00

Ejercido 2019: \$995,952.77

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de ocho aulas y aula de usos múltiples que consto de impermeabilizante, loseta, cancelería, pintura, puertas, aplanados e instalación eléctrica.



FICHA 324 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LA HACIENDITA 112139 REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas y Sanitarios de la Escuela Primaria La Obra con un avance del 42%. Haciendita en La Haciendita, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 23 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: La Haciendita, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$149,212.82

Ejercido 2019: \$145,176.02

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de techumbre, cisterna y firme de concreto.



FICHA 325 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES 112223 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel Escuela Primaria Niños Héroes ubicado en Acción terminada. Colonia Doctor Gustavo Baz, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo. Aproximadamente 186 estudiantes.

Localización:

Colonia Doctor Gustavo Baz, Ocuilan,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$104,780.30

Ejercido 2019: \$104,780.29

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas (aplanados, pisos, pintura, instalación eléctrica, impermeabilización), rehabilitación de sanitarios (pintura en general, colocación de lambrin y loseta cerámica, colocación de mamparas, retiro y colocación de salidas hidro-sanitarias, así como muebles sanitarios.



FICHA 326 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN 112407 MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN GENERAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Mantenimiento y/o Rehabilitación General de la Escuela Primaria Lic. Acción terminada. José Vasconcelos Calderón en la comunidad de San Mateo Otzacatipan, Toluca, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 150 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: San Mateo Otzacatipan, Toluca,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$300,000.00

Ejercido 2019: \$298,149.80

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y reconstrucción de barda perimetral, rehabilitación de comedor (reparación de fisuras, aplanados y pintura)



FICHA 327 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 112143 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Edificios en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Obra con un avance del 10% ubicada en la comunidad de Ahuatenco, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 134 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Ahuatenco, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,000,000.00

Ejercido 2019: \$1,990,047.20

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de cuatro aulas.



FICHA 328 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 112137 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel de la Escuela Primaria Licenciado Benito Acción terminada. Juárez ubicada en la localidad de Santa Mónica, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo. Aproximadamente 53 estudiantes.

Localización: Santa Mónica, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$140,989.09

Ejercido 2019: \$138,208.73

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas (reforzamiento de muros por medio de castillos intermedios, aplanados, pisos, pintura, instalación eléctrica, impermeabilización), rehabilitación de sanitarios (pintura en general, colocación de lambrin y loseta cerámica, colocación de puertas y mamparas, retiro y colocación de salidas hidro-sanitarias, así como muebles sanitarios)



FICHA 329 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC 112163 DEMOLICIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Demolición del Plantel escuela primaria Cuauhtémoc en la localidad Acción terminada. de San Juan Atzingo, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

San Juan Atzingo, Ocuilan, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$1,725,000.00

Ejercido 2019: \$1,720,023.59

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de cinco Aulas, Servicios Sanitarios y pintura general.



FICHA 330 **IMIFE**

PRIMARIA LICENCIADO LEÓN GUZMAN

111276 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS U-2C, REHABILITACIÓN DE 30 AULAS, UNA BIBLIOTECA, SALA DE JUNTAS, ESCALERAS, CAFETERÍA, COMEDOR, 2 MÓDULOS SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Demolición y construcción de 5 aulas U-2c, rehabilitación de 30 Obra con un avance del 10% aulas, una biblioteca, sala de juntas, escaleras, cafetería, comedor, 2 módulos sanitarios, barda perimetral y obra exterior en la Escuela BENEFICIOS GENERADOS Primaria Licenciado León Guzmán ubicada en Joquicingo de León Guzmán, México.

Aproximadamente 529 estudiantes

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Joquicingo de León Guzmán, México.

Costo de la Obra en 2019: \$4,106,646.84

Ejercido 2019: \$4,020,965.23

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y construcción de 5 aulas u-2c, rehabilitación de 30 aulas, una biblioteca, sala de juntas, escaleras, cafetería, comedor, 2 módulos sanitarios, barda perimetral y obra exterior.



FICHA 331 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 111288 REHABILITACIÓN DE COMEDOR 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Comedor en la Escuela Primaria Licenciado Benito Acción terminada. Juárez ubicada en Santa María Xoguiac, Malinalco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 46 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Santa María Xoquiac, Malinalco,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,689.95

Ejercido 2019: \$3,528.12

Fecha de Inicio: 25/05/2019

2019

Fecha de Terminación: 23/07/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación del plantel.



FICHA 332 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES 111350 RECONSTRUCCIÓN DE AULA A, C, E, F, G Y H 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Reconstrucción de Aula A, C, E, F, G y H en la Escuela primaria Niños Acción terminada. Héroes ubicada en Colonia Doctor Gustavo Baz, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Colonia Doctor Gustavo Baz, Ocuilan, Localización:

México.

Costo de la Obra en 2019: \$915,239.32

\$896,153.65 Ejercido 2019:

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Estructura regional, zapatas corridas de concreto armado, enrases de block, muros de tabique rojo, cadenas, castillos, losa de concreto armado, muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, azulejo, mamparas de láminas, azulejo, lámparas y andadores.



FICHA 333 IMIFE

PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC 112324 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en la Escuela Primaria "Héroes de Chapultepec", ubicada en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan,

México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Huixquilucan de Degollado, Municipio de

Huixquilucan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$34,488.91

Ejercido 2019: \$32702.51

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 22/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación, pintura en muros y plafón. Losetas en pisos de aulas

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 450 alumnos



FICHA 334 IMIFE

PRIMARIA NIÑOS HÉROES 112043 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en la Escuela Primaria "Niños Héroes", CCT 15EPR0932H, ubicada en San José Comalco, Municipio de Temoaya, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Acción terminada.

DATOS GENERALES Aproximadamente 313 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: ubicada en San José Comalco, Municipio

de Temoaya, México.

Costo de la Obra en 2019: \$455,000.00

Ejercido 2019: \$452,401.60

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 22/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Barda perimetral, plaza cívica, rehabilitación de dirección.



FICHA 335 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 112478 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo

y Costilla, Tianguistenco, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 250 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$100,387.57

Ejercido 2019: \$99,328.49

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Aplicación de pintura vinílica en muros de edificios y construcción de barda perimetral.



FICHA 336 IIMIFE

ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ 112515 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en la Escuela Primaria Lic. Benito Obra en proceso. Juárez, Santiago Tianguistenco de Galeana, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 386 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Santiago Tianquistenco de Galeana,

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$98,419.60

Ejercido 2019: \$97,951.54

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Aplicación de pintura vinílica en muros de edificios Ay B, así como, aplicación de impermeabilizante en edificio estructura U2-C.



FICHA 337 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL SUR 112369 TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Barda Perimetral de la Escuela Primaria Héroes del Acción terminada. Sur en Ocotenco, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 179 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Ocotenco, Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$154,787.18

Ejercido 2019: \$153,942.70

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 01/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y construcción de 55 ml de barda perimetral.



FICHA 338 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA CONSUELO TAPIA 112233 REHABILITACIÓN 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación de la Escuela Primaria Consuelo Tapia en El Islote, Villa Acción terminada. Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 200 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: El Islote, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$682,500.00

Ejercido 2019: \$669,867.60

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 339 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA 112386 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación de la Escuela Primaria Licenciado Obra en proceso. Benito Juárez García en La Lagunilla, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 240 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

La Lagunilla, Tenancingo, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$89,131.94

Ejercido 2019: \$85,440.24

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en barda perimetral, e impermeabilizante.



FICHA 340 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR 112503 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación de la Escuela Primaria Simón Bolívar Obra en proceso ubicada en la localidad de Zacango, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Zacango, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$464,197.00

Ejercido 2019: \$459,116.20

Fecha de Inicio: 18/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta, azulejo en muros, muebles sanitarios y herrería y aluminio.



FICHA 341 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 112166 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de un aula de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Acción terminada. Altamirano ubicada en la localidad de San Nicolás Coatepec de las Bateas, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 320 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: San Nicolás Coatepec de las Bateas,

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$840,925.28

Ejercido 2019: \$836,092.26

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula estructura U1C.



FICHA 342 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN 112475 REHABILITACIÓN DE AULAS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Acción terminada. ubicada en la localidad de Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 280 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$60,183.22

Ejercido 2019: \$59,245.35

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 04/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 343 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO 112480 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en la Escuela Primaria Alfredo del Acción terminada. Mazo ubicada en la localidad de Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 480 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$83,240.94

Ejercido 2019: \$82,312.36

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 344 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO 112429 REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES

TRAB AJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas, Servicios Sanitarios y Barda Perimetral de la Obra en proceso. escuela primaria Francisco Indalecio Madero ubicada en Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 354 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$185,793.96

Ejercido 2019: \$183,976.93

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de 7 aulas y construcción de barda perimetral.



FICHA 345 IMIFE

PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 111779 REHABILITACIÓN 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Acción terminada.

Rehabilitación en la Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos, Municipio de Tepotzotlán Estado de México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 800 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tepotzotlán

Costo de la Obra en 2019: \$1,401,006.97


Ejercido 2019: \$1,389,649.40

Fecha de Inicio: 03/09/ 2019

Fecha de Terminación: 01/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Impermeabilización de 9 edificios tipo regional pintura, colocación de piso, desmantelamiento de instalaciones eléctricas, cancelería, acabados

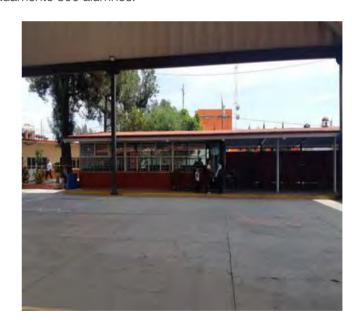

FICHA 346 IMIFE

PRIMARIA JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN 112419 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Primaria Juan Fernández Albarrán Acción en proceso.

Municipio de Tultitlan Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tultitlán de Mariano Escobedo

Costo de la Obra en 2019: \$629,935.26

Ejercido 2019: \$627,234.78

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de comedor Tipo U1 Y Aulas Tipo U1-C.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 450 alumnos.



FICHA 347 IMIFE

PRIMARIA LEONA VICARIO 112025 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela primaria leona vicario Municipio de Tultitlan Estado de México.

Acción terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tultitlan

Costo de la Obra en 2019: \$188,301.90

Ejercido 2019: \$184,036.00

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de techumbre de espuma poliuretano en tres módulos de aulas así como demoliciones, aplanados.



FICHA 348 IMIFE

PRIMARIA VICENTE GUERRERO 112086 REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Vicente Guerrero Municipio de Huehuetoca Acción terminada.

Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Huehuetoca

Costo de la Obra en 2019: \$940,365.45

Ejercido 2019: \$929,490.45

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de aplanados, pintura, cancelería, piso, puertas de aluminio, desmontaje y montaje de instalaciones eléctricas.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 349 **IMIFE**

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 111958 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Miguel Hidalgo y Costilla Municipio de Acción terminada. Zumpango Estado de México.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Zumpango de Ocampo

Costo de la Obra en 2019: \$84,977.10

Ejercido 2019: \$77,877.90

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de Edificio U2-C Y Edificio U1-C, colocación de pintura, loseta, aplanados, picado.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 440 alumnos.



FICHA 350 IMIFE

PRIMARIA BASILIO BADILLO 112315 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela primaria Basilio Badillo Municipio Cuautitlán Izcalli Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$262,129.93

Ejercido 2019: \$260,215.93

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aplanados, pintura, impermeabilizante, cancelería, pisos de loseta, colocación de puertas.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 351 IMIFE

PRIMARIA PROFESORA. FRANCISCA ROMERO SALGADO

112544 REHABILITACIÓN DE AULAS, TALLERES DE CÓMPUTO, MÓDULOS SANITARIOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela primaria Francisca Romero Salgado. Acción en proceso.

Programa de Acciones para el

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

Desarrollo.

Localización: San Pablo de las Salinas

Costo de la Obra en 2019: \$975,779.95

Ejercido 2019: \$973,831.15

Fecha de Inicio: 10/09/2019

Fecha de Terminación: 08/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

PROGRAMA:

Demolición, desmontaje de instalaciones, desmantelamiento de cancelería, puertas, demolición de edificios U2-C Y Edificio U1-C.



FICHA 352 IMIFE

PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS 112300 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Primaria José María Morelos, ubicada en Tepotzotlán, México.

Acción terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tepotzotlán

Costo de la Obra en 2019: \$758,062.53

Ejercido 2019: \$756,181.70

Fecha de Inicio: 29/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aplanados, pintura, colocación de azulejos, demolición de pisos, colocación de concreto.



FICHA 353 IMIFE

PRIMARIA PROFESOR. CARLOS HANK GONZÁLEZ 112035 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Profesor. Carlos Hank González. Acción terminada.

Programa de Acciones para el

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$224,138.04

Ejercido 2019: \$110,105.14

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

PROGRAMA:

Rehabilitación de aulas de usos múltiples, aplanados, losetas, pintura, construcción de barda perimetral.



FICHA 354 IMIFE

PRIMARIA CUAUHTÉMOC 112303 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación Primaria Cuauhtémoc., ubicada en Tepotzotlán,

México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tepotzotlán

Costo de la Obra en 2019: \$185,358.23

Ejercido 2019: \$185,358.23

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aplanados, acabado de loseta, pintura y acabados.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 200 alumnos.



FICHA 355 IMIFE

PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN 111937 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación Primaria Salvador Díaz Mirón.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$648,120.80

Fecha de Inicio: 04/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas y pavimentación.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 350 alumnos.



FICHA 356 IMIFE

PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA 114386-208 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Municipio de Zumpango Estado de México. Acción en proceso.

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples Aproximadamente 490 alumnos.

Localización: Zumpango

Costo de la Obra en 2019: \$150,000.00

Ejercido 2019: \$150,000.00

Fecha de Inicio: 24/07/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Segunda Etapa de Rehabilitación del Plantel



FICHA 357 IMIFE

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 111999 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Primaria Miguel Hidalgo, ubicado en San Pedro Los Baños Municipio de Ixtlahuaca, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Acción en proceso.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Ixtlahuaca

Costo de la Obra en 2019: \$750,000.00

Ejercido 2019: \$748,042.50

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

DATOS GENERALES

Rehabilitación general de plantel.



FICHA 358 IMIFE

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 112282 REHABILITACION 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en Ejido la Gavia (San José la Gavia), Municipio de Almoloya de Juárez.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Almoloya de Juárez.

Costo de la Obra en 2019: \$61,995.58

Ejercido 2019: \$57,227.97

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación general, pintura, impermeabilización.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción por iniciar.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 316 alumnos.



FICHA 359 IMIFE

PRIMARIA CUITLAHUAC 112036 REHABILITACION 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la escuela primaria Cuitláhuac ubicado en Barrio del Jacal de Yebucivi, Municipio de Almoloya de Juárez, México.

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 38 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Almoloya de Juárez.

Costo de la Obra en 2019: \$61,495.51

Ejercido 2019: \$59,444.52

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cancelería, puertas, acceso, muro de acometida.



FICHA 360 IMIFE

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 112594 REHABILITACION 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, México.

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 103 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Donato Guerra.

Costo de la Obra en 2019: \$48,573.31

Ejercido 2019: \$45,535.78

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación general, cambio de pisos, pintura, cancelería, luminarias y andadores.



FICHA 361 IMIFE

PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 112595 REHABILITACION 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la escuela Primaria Fray Bartolomé de las casas, ubicada en Donato Guerra, municipio de Donato Guerra.

Acción no iniciada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 577 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Donato Guerra.

Costo de la Obra en 2019: \$55,585.16

Ejercido 2019: \$52,927.89

Fecha de Inicio: 17/08/ 2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación general, retiro de impermeabilizante, entortados y colocación de impermeabilizante.



FICHA 362 **IMIFE**

PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 112122 REHABILITACION DE AULAS 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas Comedor y Construcción de Techumbre, en Acción terminada. la escuela primaria Guadalupe Victoria, ubicada en Villa Victoria, municipio de Villa Victoria, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 897 alumnos.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Municipio de Villa Victoria.

Costo de la Obra en 2019: \$228,543.71

Ejercido 2019: \$226,406.40

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se construyó una techumbre de tres entre ejes con estructura mabaja a dos aguas y cubierta de galvateja, se impermeabilizo el edificio, después de nivelar la losa con entortado.



FICHA 363 IMIFE

PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 112531 TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y RED DE CUBIERTA DE ARCOTECHO 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Barda Perimetral y Red de Cubierta de Arcotecho, ubicado en San Juan Xoconusco, en la escuela Primaria José Vasconcelos, Municipio de Donato Guerra, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Apr

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Donato Guerra.

Costo de la Obra en 2019: \$178,706.20

Ejercido 2019: \$175,742.40

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación del plantel, demolición de bardas existentes, construcción de barda.



FICHA 364 IMIFE

PRIMARIA JAIME TORRES BODET 111753 REHABILITACION 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la escuela Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Llano Redondo de Zaragoza, municipio de Donato Guerra, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 100 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Donato Guerra.

Costo de la Obra en 2019: \$188,343.48

Ejercido 2019: \$186,673.08

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación del plantel, rehabilitación de núcleo de servicios sanitarios, pintura en plafond, muros y zoclos, colocación de loseta, impermeabilizante.



FICHA 365 **IMIFE**

PRIMARIA PROFRESOR JUAN B. GARZA 111747 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de la Rehabilitación en la escuela Profesor Juan B. Acción en proceso. Garza en el Municipio de Ecatepec Estado de México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$2,658,278.19

Ejercido 2019: \$2,650,702.64

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de demolición y reconstrucción de 7 aulas y núcleo sanitario.



FICHA 366 **IMIFE**

PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS 112292 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Rosario Castellanos, ubicada en el Acción terminada. Municipio de Ecatepec, México.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$1,578,001.64

Ejercido 2019: \$1,569,374.95

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 2 aulas, obra exterior y acceso.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 367 **IMIFE**

PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS 112319 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Primaria Rosario Castellanos Municipio de Acción terminada.

Ecatepec Estado de México.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$1,469,806.45

Ejercido 2019: \$836,914.16

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y rehabilitación de toda la escuela.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 368 IMIFE

PRIMARIA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO 1 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ 112320 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación En Escuela Primaria Centro Bachillerato tecnológico 1

Jorge Jiménez Cantú en el Municipio De Tecámac

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tecámac de Felipe Villanueva

Costo de la Obra en 2019: \$1,651,643.40

Ejercido 2019: \$1,643,205.10

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de demolición y reconstrucción de 2 aulas, taller, núcleo sanitario y bodega.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 369 IMIFE

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN 113013 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel Primaria Ricardo Flores Magón en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$4,332,243.20

Ejercido 2019: \$4,325,365.53

Fecha de Inicio: 25/07/ 2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de aulas de autoconstrucción y construcción de 4 aulas, escaleras y obra exterior.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 370 IMIFE

PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 113031 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel Primaria Belisario Domínguez en Ecatepec Acción terminada.

Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$4,180,520.64

Ejercido 2019: \$4,172,350.32

Fecha de Inicio: 25/07/ 2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de aplanados, pintura general, impermeabilización y cambio de lámparas.

7 toolori torriiriada.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 371 **IMIFE**

PRIMARIA LIBERTADORES DE MÉXICO 111745 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Libertadores de México en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$219,012.21

Ejercido 2019: \$217,851.05

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de sustitución aplanados, general, pintura impermeabilización.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 372 **IMIFE**

PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 111748 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Primaria Licenciado Adolfo López Mateos en el Acción terminada. Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$310,235.33

Ejercido 2019: \$308,583.78

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de construcción de barda perimetral, portón y tapas de registros

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 373 IMIFE

PRIMARIA MIGUEL DE LA MADRID 112131 REHABILITACIÓN 02050101013

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Miguel De La Madrid En El Acción terminada.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$134,072.97

Ejercido 2019: \$133,302.43

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de barda, y demolición y reconstrucción de muros en aulas, pintura, malla ciclónica en barda.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 374 **IMIFE**

PRIMARIA LICENCIADO ISIDRO FABELA ALFARO 112155 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Licenciado Isidro Fabela Alfaro En Acción terminada.

Ecatepec De Morelos

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$270,384.65

Ejercido 2019: \$267,252.64

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de plaza cívica.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 375 IMIFE

PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 111746 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez En El Acción terminada.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$309,861.23

Ejercido 2019: \$307,963.18

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de sustitución de aplanados, pintura general,

impermeabilización.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 376 IMIFE

PRIMARIA OCTAVIO PAZ 111839 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Octavio Paz En El Municipio De Acción terminada.

Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$425,000.00

Ejercido 2019: \$421,654.52

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de 4 aulas, impermeabilización y cambio de instalación hidro-sanitaria.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 377 IMIFE

PRIMARIA ISIDRO FABELA 111938 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación En Escuela Primaria Isidro Fabela en el Municipio de Ecatepec, Municipio de Ecatepec de Morelos

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$643,325.36

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de instalación eléctrica en 6 aulas, impermeabilización y cambio de techumbre de multipanel.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 378 **IMIFE**

PRIMARIA JOSÉ MARTÍ 112291 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria José Martí en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$490,055.75

Ejercido 2019: \$489,842.02

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de aplanados, pintura general, impermeabilización.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 376 IMIFE

PRIMARIA PROFESOR CARLOS CARRILLO 112011 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Profesor Carlos Carrillo En El Acción terminada.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$425,000.00

Ejercido 2019: \$421,654.52

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de 6 aulas, aplanados, pintura, lambrines de azulejo rehabilitación de plaza cívica.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 380 IMIFE

PRIMARIA ERMILO ABREU

114386-052 TERMINACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO, DESMONTAJE Y TRASLADO DE 6 AULAS PROVISIONALES, INSTALACION DE 4 AULAS PROVISIONALES 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Ermilo Abreu en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Desarrollo.

Localización:

Calle Cancer s/n esq. Con Calle

Escorpion

Costo de la Obra en 2019: \$478,500.00

Ejercido 2019: \$333,300.00

Fecha de Inicio: 05/07/2019

Fecha de Terminación: 02/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalación de 4 aulas provisionales.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 381 IMIFE

PRIMARIA HERMANOS SERDAN 111781 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Hermanos Serdán Primaria Hermanos Serdán En El Municipio de Acolman Estado De México

Acción terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tepexpan

Costo de la Obra en 2019: \$500,000.00

Ejercido 2019: \$494,430.26

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas, pintura, instalación eléctrica, cambio de loseta e impermeabilización



FICHA 382 IMIFE

PRIMARIA FRIDA KAHLO 114386-216 BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Frida Kahlo en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec Estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Calle Ignacio Aldama s/n

Costo de la Obra en 2019: \$5,145,000.00

Ejercido 2019: \$5,129,000.00

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral.

BENEFICIOS GENERADOS



FICHA 383 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA PROFESORA CONSUELO TAPIA 111355 REPARACION DE FISURAS EN MUROS Y TRABES Y COLUMNAS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reparación de Fisuras En Muros, Trabes Y Columnas en la Escuela Acción terminada. Primaria Profesora Consuelo Tapia ubicada en El Islote, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 200 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: El Islote, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,380,915.90

Ejercido 2019: \$1,352,717.67

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 384 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 111359 REHABILITACIÓN DE 4 AULAS Y SANITARIOS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación De 4 Aulas y Sanitarios en la Escuela Primaria Acción terminada. Licenciado Benito Juárez en la localidad de El Moral, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 240 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

El Moral, Villa Guerrero, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$1,327,382.99

Ejercido 2019: \$1,300,417.66

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 385 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO 111357 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO TALLER FALLAS ESTRUCTURALES EN TRABES MUROS Y COLUMNAS. 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Laboratorio Taller Fallas Estructurales en Trabes Acción terminada. Muros y Columnas de la Escuela Primaria 5 De Mayo ubicada en Tequimilpa, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Tequimilpa, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,606,967.13

Ejercido 2019: \$1,565,245.70

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 386 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 111366 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Edificios en la Escuela Primaria Justo Sierra ubicada Acción terminada. en San Mateo Coapexco, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 160 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: San Mateo Coapexco, Villa Guerrero,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,400,000.01

Ejercido 2019: \$1,363,793.50

Fecha de Inicio: 25/05/ 2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 387 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA DOCTOR GUSTAVO BAZ 111396 REPARACION DE FISURA EN ARCO UBICADO EN LOS PASILLOS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reparación de Fisura en arco ubicado en los Pasillos de la Escuela Obra en proceso. Primaria Doctor Gustavo Baz ubicada en Totolmajac, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 120 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Totolmajac, Villa Guerrero, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$85,000.00

Ejercido 2019: \$82,611.15

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 23/06/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 388 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 111353 REPARACION DE MUROS EN BAÑOS DE SANITARIOS CON FISURAS LEVES 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reparación de Muros en Baños de Sanitarios con Fisuras Leves de la Obra por iniciar. Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez en la localidad de San Mateo Coapexco (Ejido), Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 80 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: San Mateo Coapexco (Ejido), Villa

Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$878,287.91

Ejercido 2019: \$862,917.88

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 22/08/ 2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante



FICHA 389 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 111363 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Edificios en la Escuela Primaria Venustiano Carranza Acción terminada. ubicada en Cruz Vidriada, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Cruz Vidriada, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$408,937.48

Ejercido 2019: \$398,090.97

Fecha de Inicio: 25/05/ 2019

Fecha de Terminación: 22/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio, impermeabilizante, muebles sanitarios y herrería.



FICHA 390 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 111372 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Edificios Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez Obra en proceso. ubicada en Porfirio Díaz, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 280 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Porfirio Díaz, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$727,786.71

Ejercido 2019: \$709,259.25

Fecha de Inicio: 25/05/ 2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 391 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES 111400 REPARACION DE FISURAS EN MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reparación de Fisuras en Muros e Impermeabilización de Aula en la Obra en proceso. Escuela Primaria Plutarco Elías Calles ubicada en Villa Guerrero. México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 160 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$932,015.99

Ejercido 2019: \$908,322.43

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 22/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 392 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 111347 CONSTRUCCIÓN DE 3 EDIFICIOS CON 4 AULAS TIPO REGIONAL 1 DIRECCIÓN, 1 BIBLIOTECA, 1 MÓDULO DE SANITARIOS, 30 METROS LINEALES DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

Construcción de 3 Edificios con 4 Aulas Tipo Regional 1 Dirección, 1 Biblioteca, 1 Módulo de Sanitarios, 30 Metros Lineales de Barda Perimetral y Obra Exterior en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en Las Trojes, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Las Trojes, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,682,233.60

Ejercido 2019: \$3,670,411.27

Fecha de Inicio: 25/05/ 2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 3 edificios con 4 aulas tipo regional 1 dirección, 1 biblioteca, 1 módulo de sanitarios, 30 metros lineales de barda perimetral.

TRABAJOS FJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 180 estudiantes.



FICHA 393 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO 111348 CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS CON 2 AULAS TIPO REGIONAL, 1 SALA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de 2 Edificios con 2 Aulas Tipo Regional, 1 Sala de Usos Obra en proceso Múltiples y Obra Exterior de la Escuela Primaria General Vicente Guerrero ubicada en Cinco Caminos, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 180 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Cinco Caminos, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,100,000.00l

Ejercido 2019: \$2,094,000.00

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 2 edificios con dos aulas tipo regional.



FICHA 394 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD 111354 RECONSTRUCCIÓN DE TOTAL DE AULAS A, B Y C 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reconstrucción de Total de Aulas A, B y C de la Escuela Primaria Obra en proceso. Libertad en la localidad de Tlatempa, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 80 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarroll.

Localización: Tlatempa, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$5,368,001.70

Ejercido 2019: \$5,364,321.68

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 2 edificios con dos aulas tipo regional.



FICHA 395 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA 112269 REHABILITACIÓN 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

PROGRAMA:

Rehabilitación de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez Acción terminada. García, Tenancingo de Degollado, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Tenancingo de Degollado, Tenancingo,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,050,000.00

Ejercido 2019: \$1,049,999.98

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 396 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 111742 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 3 SS PROVISIONALES 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Instalación Y Suministro de 3 SS Provisionales en la Escuela Primaria Acción terminada. Ignacio Zaragoza ubicada en la localidad de San Bartolomé (San Bartolo), Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

San Bartolomé (San Bartolo), Villa Localización:

Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,300,000.00

Ejercido 2019: \$1,300,000.00

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 397 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA HOGAR CAMPESINO 112205 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel Escuela Primaria Hogar Campesino ubicada Acción terminada. en San Lucas, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 160 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: San Lucas, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$21,092.67

Ejercido 2019: \$20,432.04

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 04/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 398 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA DOCTOR GUSTAVO BAZ 112206 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel Escuela Primaria Doctor Gustavo Baz Acción terminada. ubicada en Totolmajac, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Totolmajac, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$150,000.00

Ejercido 2019: \$148,940.91

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 399 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN 112207 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel escuela primaria Revolución en la localidad Acción terminada.

de La Loma de la Concepción, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: La Loma de la Concepción, Villa

Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$113,658.925

Ejercido 2019: \$111,953.71

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Zapata y contratrabes de concreto armado, muro de tabique rojo recocido y acabado de pintura.



FICHA 400 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA PROFESOR AGRIPÍN GARCÍA ESTRADA 112231 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel de la Escuela Primaria Profesor Agripín Acción terminada. García Estrada ubicada en Zanjillas San Bartolomé, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 80 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Zanjillas San Bartolomé, Villa Guerrero, Localización:

México.

Costo de la Obra en 2019: \$118,922.24

Ejercido 2019: \$116,012.97

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 401 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO 111743 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel de la Escuela Primaria Ciencia Y Trabajo Acción terminada. ubicada en San José, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 160 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: San José, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$50,090.59

Ejercido 2019: \$48,204.08

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 402 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO 112228 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda Etapa de la Rehabilitación de la Escuela Primaria 5 de Mayo Acción terminada. en la localidad de Tequimilpa, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Tequimilpa, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,137,500.00

Ejercido 2019: \$1,125,169.53

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Firme de concreto en plaza cívica.



FICHA 403 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 112495 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación del Plantel de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas ubicada en Los Ranchos de San José, Villa Guerrero, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Los Ranchos de San José, Villa

Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$249,780.73

Ejercido 2019: \$245,950.38

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Zapata y contratrabes de concreto armado, muro de tabique rojo recocido y acabado de pintura.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 estudiantes.



FICHA 404 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA DOCTOR GUSTAVO BAZ 112204 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda Etapa de la Rehabilitación en la escuela primaria Doctor Acción terminada. Gustavo Baz ubicada en Zacango, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 160 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Zacango, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$145,612.91

Ejercido 2019: \$143,903.07

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante



FICHA 405 IMIFE

ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 112222 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda Etapa de la Rehabilitación en la Escuela Primaria Venustiano Obra en proceso. Carranza ubicada en Cruz Vidriada, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Cruz Vidriada, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$31,281.73

Ejercido 2019: \$30,388.52

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 04/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 406 **IMIFE**

PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 112077 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Jardín de Niños "Serafín Peña", ubicada en Acción en proceso. Cerro Colorado, Municipio de Valle de Bravo, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Cerro Colorado, Municipio de Valle de Localización:

Bravo, México

Costo de la Obra en 2019: \$82,674.74

Ejercido 2019: \$80,799.02

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Terminación: 16/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 68 alumnos



FICHA 407 **IMIFE**

ESCUELA PRIMARIA JUAN ÁLVAREZ 111289 REHABILITACIÓN DE AULAS Y COCINA 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas y Cocina de la Escuela Primaria Juan Álvarez Acción terminada. ubicada en Pachuquilla, Malinalco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 51 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Pachuquilla, Malinalco, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$647,082.77

Ejercido 2019: \$647,932.13

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 23/06/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas y cocina.



FICHA 408 IMIFF

ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZÚÑIGA 111356 RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, B Y C 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reconstrucción de Edificio A, B y C de la Escuela Primaria Horacio Zúñiga ubicada en Tepetzingo, Ocuilan, México

Obra en proceso.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Aproximadamente 200 estudiantes.

Localización: Tepetzingo, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$6,110,279.20

Ejercido 2019: \$6,079,176.41

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Estructura regional, zapatas corridas de concreto armado, enrases de block, muros de tabique rojo, cadenas, castillos, losa de concreto armado, muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, azulejo, mamparas de láminas, azulejo, lámparas y andadores.



FICHA 409 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES 111393 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Escuela, Demolición y Construcción de Aula y Obra Obra en proceso. Exterior en la Escuela Primaria Niños Héroes ubicada en Ahuatenco, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 130 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Ahuatenco, Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,000,000.00

Ejercido 2019: \$982,500.00

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realizaron trabajos de demolición de aula existente, se llevó a cabo excavación, habilitado y armado de acero en cimentación y estructura, construcción de muros de tabique.

FICHA 410 **IMIFF**

ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ 111413 REHABILITACIÓN DE ESCUELA Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Escuela y Obra Exterior de la Escuela Primaria Acción terminada. Profesor Carlos Hank González ubicada en Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita), Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 760 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita),

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,981,027.00

Ejercido 2019: \$2,976,216.42

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 22/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro de impermeabilizante en mal estado, elaboración de entortado, colocación de impermeabilizante prefabricado.

FICHA 411 IMIFF

ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ 111405 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Demolición y Construcción de 2 Aulas y Salón de Usos Múltiples y Obra Exterior de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez en la localidad de Ex-Hacienda de Atenco, Tianguistenco, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 80 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Ex-Hacienda de Atenco, Tianguistenco,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,609,700.32

Ejercido 2019: \$1,608,603.32

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 23/06/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realizó la construcción de barda perimetral, rehabilitación de un edificio (3 aulas y sanitarios).



FICHA 412 **IMIFF**

PRIMARIA LUDWIG VAN BEETHOVEN 112115 CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS Y BARDA PERIMETRAL 020501010103 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación En Escuela Primaria Ludwig Van Beethoven En El Acción terminada. Municipio De Valle De Chalco Solidaridad Estado De México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Xico

Costo de la Obra en 2019: \$2,831,854.70

Ejercido 2019: \$2,824,334.27

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Herrería y aluminio: ventana de aluminio en aulas, colocación de puertas. instalación eléctrica, salida de centro, contactos, interruptor termomagnético, luminaria fluorescente, centro de carga. andadores: limpia, trazo, excavación, acarreo, relleno, piso de concreto, limpieza. barda perimetral: trazo, excavación, acarreo, relleno, plantilla, muro de tabique, aplanado de mezcla, pintura vinílica en muro, castillo tipo k-1, k-2.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 413 **IMIFF**

PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 112262 REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Benemérito de Las Américas en el Acción terminada. Municipio de Valle de Chalco Solidaridad estado de México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Colonia Calle Santa Cruz Amalinalco

Costo de la Obra en 2019: \$134,294.94

Ejercido 2019: \$134,594.51

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de impermeabilizante aparente. Herrería y aluminio: ventana de aluminio en aulas, colocación de puertas. Andadores: limpia, trazo, excavación, acarreo, relleno, piso de concreto, limpieza. barda perimetral: trazo, excavación, acarreo, relleno, plantilla, muro de tabique, aplanado de mezcla, pintura vinílica en muro, castillo tipo k-1, k-2, cadena de cerramiento, acero de refuerzo en cimentación del #3, #4, cimbra, concreto.



FICHA 414 IMIFE

PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 112517 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz En El Acción en proceso.

Municipio de Atlautla Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: San Juan Tepecoculco

Costo de la Obra en 2019: \$61,701.50

Ejercido 2019: \$61,833.61

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Primera etapa de rehabilitación.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 415 IMIFE

PRIMARIA CALMECAC 112287 SUSTITUCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Primaria Calmecac En El Municipio De Acción terminada.

Chalco estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Chalco de Díaz Covarrubias

Costo de la Obra en 2019: \$223,533.74

Ejercido 2019: \$219,316.56

Fecha de Inicio: 10/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Barda perimetral (demolición de muro, castillos, excavación, plantilla, armado de zapata y contratrabe, relleno de tepetate, muros, castillos, cadenas, aplanado y pintura).

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 300 alumnos.



FICHA 416 IMIFE

PRIMARIA VICENTE GUERRERO 112545 SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010103

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Primaria Vicente Guerrero En El Municipio Acción terminada.

De Chalco Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Chalco de Díaz Covarrubias

Costo de la Obra en 2019: \$89,677.78

Ejercido 2019: \$89,251.46

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Barda perimetral (excavación, plantilla, armado de zapata y contratrabe, relleno de tepetate, muros, castillos, cadenas, aplanado y pintura plaza cívica.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 300 alumnos.



FICHA 417 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL. No.0293 "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" 114386-220 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de edificio y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0293 "José Clemente Orozco", ubicada en Plaza Principal No. 1, San Miguel (San Miguel Zinacausto), Municipio de Amatepec, México

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportación de Múltiples.

Localización: Plaza Principal No. 1, San Miguel (San

Miguel Zinacausto), Municipio de

Amatepec, México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,497,592.78

Ejercido 2019: \$3,496,930.07

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de edificio y colocación de barda perimetral



FICHA 418 IMIFE

SECUNDARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA 114386-342 TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE CÓMPUTO 0205010105 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Terminación de dos aulas de computo, en la Escuela Secundaria por Televisión; ubicada en Carretera Municipal Libre, de Localidad Dios Padre a Localidad San Antonio Pueblo Nuevo, km. 0.5, Ejido la Virgen; Municipio de San Felipe del Progreso, México.

Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 alumnos.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de aportaciones Múltiples.

Localización: Carretera Municipal Libre, de Localidad

Dios Padre a Localidad San Antonio Pueblo Nuevo, km. 0.5, Ejido la Virgen,

San Felipe del Progreso.

Costo de la Obra en 2019: \$1,147,900.14

Ejercido 2019: \$1,144,754.84

Fecha de Inicio: 07/10/2019

Fecha de Terminación: 25/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Relleno y colado en firmes, suministro de red eléctrica, entortado en losas, colocación de impermeabilizante, colocación de cancelerías, aplanado y aplicación de pintura en muros.



FICHA 419

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO TLATLAYA 115426-07 REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR 0205010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación general y obra exterior, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, ubicado en Coatepec, Municipio de Tlatlaya, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM)

Localización: Coatepec, Municipio de Tlatlaya, México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,249,206.85

Ejercido 2019: \$3,235,886.54

Fecha de Inicio: 18/10/2019

Fecha de Terminación: 26/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se pintó, se colocaron puertas, reparación de ventanas, instalación de red eléctrica.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 115 alumnos



FICHA 420

SECUNDARIA GENERAL No. 0179 "FRANCISCO I. MADERO" 114386-053 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CÍVICA 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza cívica, en la Escuela Secundaria General No. 0179 "Francisco I. Madero", ubicada en Limón No. 41, Bejucos, Municipio de Tejupilco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Limón No. 41, Bejucos, Municipio de

Tejupilco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$220,226.91

Ejercido 2019: \$220,226.87

Fecha de Inicio: 17/06/2019

Fecha de Terminación: 16/07/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de barda perimetral a base de zapatas corridas y terminación de techumbre en plaza cívica a base de zapatas aisladas y estructura de acero.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 174 alumnos



FICHA 421 IMIFE

SECUNDARIA POR TELEVISIÓN" 1º. DE MAYO" 114386-064 SEGUNDA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES

Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "1º. de Mayo", ubicada en Cuadrilla de López, Municipio de Tejupilco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM)

Localización: Cuadrilla de López, Municipio de

Tejupilco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,698,877.10

Ejercido 2019: \$1,687,158.93

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 3 aulas tipo regional, modulo sanitarios tipo piare, red eléctrica, obra de captación para agua pluviales.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 150 alumnos



FICHA 422 IMIFF

SECUNDARIA No. 1110 NARCISO BASSOLS 114386-039 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y MÓDULOS SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la Construcción de 3 aulas, área administrativa, y Módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria general No. 1110 Narciso Bassols; ubicada en Domicilio conocido, San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Domicilio conocido, San Iorenzo

Tlacotepec, Atlacomulco.

Costo de la Obra en 2019: \$760,000.00

Ejercido 2019: \$560,545.32

Fecha de Inicio: 05/07/2019

Fecha de Terminación: 02/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de la construcción de las 3 aúllas, módulos sanitarios y área administrativa, en edificio tipo U-2C.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 150 alumnos.



FICHA 423 **IMIFF**

SECUNDARIA No. 0411 MTRO. ALFONSO BADILLO 114386-242 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 200 ML. DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción de 200 ML. De Barda Perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo; ubicad en Kilometro 6 carretera Jiquipilco-Jilotepec, Ejido de Ioma de BENEFICIOS GENERADOS Malacota, Municipio de Jilotepec, México.

DATOS GENERALES

Fondo de aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Kilómetro 6 carretera Jiquipilco-

Jilotepec, Ejido de Loma de Malacota,

Jilotepec.

Costo de la Obra en 2019: \$416,000.00

Ejercido 2019: \$414,839.96

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro de malla ciclónica existente y construcción de 200 ml. De barda perimetral con tabique rojo, aplanado y aplicación de pintura.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

Aproximadamente 100 alumnos.



FICHA 424 **IMIFF**

SECUNDARIA No. 0721 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 114386-244 TERMINACIÓN DE MÓDULO DE ESCALERAS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de módulo de escaleras, en la Escuela Secundaria General No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta; ubicada en Presa Las Animas; San pedro El Alto, Municipio de San Felipe del BENEFICIOS GENERADOS Progreso, México.

Obra terminada.

Aproximadamente 100 alumnos.

DATOS GENERALES

Fondo de aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Presa Las Animas, San Pedro El Alto,

San Felipe del Progreso.

Costo de la Obra en 2019: \$255,000.00

Ejercido 2019: \$253,008.15

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de módulo de escaleras a un costado del edificio. construcción, aplanado y pintura en muros, colocación de barandales y forjado de escalones.



FICHA 425 IMIFE

SECUNDARIA NO. 0873 PROFR. CÉSAR BERNAL MERCADO 114386-248 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General No. 0873 Profr. Cesar Bernal Mercado; ubicada Atrás del C.B.T.A., Loma del Astillero, Municipio de Jiquipilco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de aportaciones Múltiples.

Localización: Atrás del C.B.T.A., Loma del Astillero,

Jiquipilco.

Costo de la Obra en 2019: \$80,000.00

Ejercido 2019: \$79,302.20

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 24/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de la construcción de un aula; colocación de cancelerías, aplanado y pintura en muros.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 50 alumnos.



FICHA 426 **IMIFF**

SECUNDARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA 114386-342 TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE CÓMPUTO 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de dos aulas de computo, en la Escuela Secundaria por Televisión; ubicada en Carretera Municipal Libre, de Localidad Dios Padre a Localidad San Antonio Pueblo Nuevo, km. 0.5, Ejido la BENEFICIOS GENERADOS Virgen; Municipio de San Felipe del Progreso, México.

DATOS GENERALES

Fondo de aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Carretera Municipal Libre, de Localidad

> Dios Padre a Localidad San Antonio Pueblo Nuevo, km. 0.5, Ejido la Virgen,

San Felipe del Progreso.

Costo de la Obra en 2019: \$1.147.900.14

Ejercido 2019: \$1,144,754.84

Fecha de Inicio: 07/10/2019

Fecha de Terminación: 25/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Relleno y colado en firmes, suministro de red eléctrica, entortado en losas, colocación de impermeabilizante, colocación de cancelerías, aplanado y aplicación de pintura en muros.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra en proceso.

Aproximadamente 100 alumnos.



FICHA 427 IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL No. 166 115426-02 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020502010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Fondo de aportaciones Múltiples.

Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 166; ubicada en Emilio Portes Gil, Municipio de San Felipe del Progreso, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 alumnos.

Obra en proceso.

Localización: Emilio Portes Gil, San Felipe del

Progreso.

Costo de la Obra en 2019: \$720,000.00

Ejercido 2019: \$708,302.73

Fecha de Inicio: 08/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Colocación de impermeabilizante en losas del plantel.



FICHA 428 IMIFE

SECUNDARIA NO. 087 LIC. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 114386-015 IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA DE EDIFICIOS A, C Y E 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Impermeabilización y aplicación de pintura de edificios A, C y E en la Secundaria General No. 087 Lic. Andrés Molina Enríquez, Cuitláhuac No. 901 San Antonio la Isla, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 24 estudiantes.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Cuitláhuac No. 901 San Antonio la Isla,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$600,000.00


Ejercido 2019: \$599,999.99

Fecha de Inicio: 22/02/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro de impermeabilizante existente. Colocación de impermeabilizante aparente modificado con refuerzo central de firma de poliéster, Así como la aplicación de pintura.

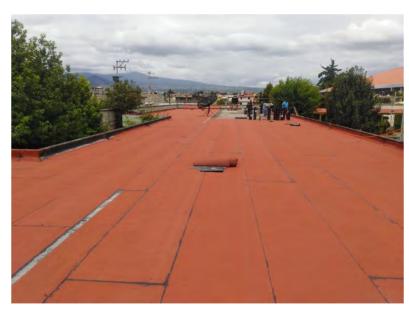

FICHA 429 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 189 JAIME NUNÓ 114386-290 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL (CO) 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co) de la Escuela Acción terminada. Secundaria General Numero 189 Jaime Nunó ubicada en Progreso Num. 1, San Miguel Tecomatlán, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 193 estudiantes.

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Progreso Num. 1, San Miguel

Tecomatlán, Tenancingo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,699,965.67

Ejercido 2019: \$3,586,286.22

Fecha de Inicio: 8/01/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de sanitarios, aplicación de pintura vinílica, colocación de muebles sanitarios y colocación de impermeabilizante.



FICHA 430 **IMIFF**

TELESECUNDARIA PASTEUR 114386-060 TERMINACIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios de la Telesecundaria Acción terminada. Pasteur ubicada en Calle Reforma No. 3, Ahuatenco, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Calle Reforma No. 3, Ahuatenco,

Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,327,422.71

Ejercido 2019: \$2,326,744.99

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Estructura regional, zapatas corridas de concreto armado, enrases de block, muros de tabique rojo, cadenas, castillos, losa de concreto armado, muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, azulejo, mamparas de láminas, azulejo, lámparas y andadores. Rehabilitación de plaza cívica, fosa séptica, barda perimetral.



FICHA 431 **IMIFF**

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 0712 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

114386-075 RETIRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS A, C Y E, REPOSICIÓN DE MURO Y APLANADOS DAÑADOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, RETIRO DE ESCOMBRO Y RECONSTRUCCIÓN DE 30 M2 DE BARDA Y APLICACIÓN DE PINTURA 020501010105

ANTECEDENTES

Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañados en el salón de usos. Obra con un avance del 80% múltiples, retiro de escombro y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura en la Escuela Secundaria General Numero BENEFICIOS GENERADOS 0712 Sor Juana Inés de la Cruz ubicada en El Mirasol. Tianquistenco, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

El Mirasol, Tianguistenco, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$595,000.00

Ejercido 2019: \$58.302.79

Fecha de Inicio: 9/09/2019

Fecha de Terminación: 7/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de Biblioteca estructura tipo U-1C de 4 ejes, cimentación a base de zapatas aisladas de concreto armado, trabes y losa de concreto armado, muros de carga de tabique rojo recocido, barda perimetral con muro de contención de piedra braza y barda de tabique rojo recocido, aplanados de mezcla ambos lados, construcción de plaza y andadores.

TRABAJOS EJECUTADOS



FICHA 432 **IMIFF**

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0349 ANTONIO DE MENDOZA 114386-311 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción y equipamiento de 2 aulas en la Escuela Secundaria Obra en proceso Oficial Numero 0349 Antonio de Mendoza ubicada en la localidad de Colonia Zaragoza de Guadalupe, Calimaya, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Colonia Zaragoza de Guadalupe,

Calimaya, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,496,885.32

Ejercido 2019: \$1,157,081.92

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 2 aulas tipo U-1C, cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura: a base de columnas y trabes de concreto armado y muros de tabique rojo recocido, losa de concreto armado. Acabados: a base de pintura acrílica, cancelería y puertas.



FICHA 433 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 222 GRAL, PEDRO MARIA ANAYA 114386-319 SUSTITUCIÓN DE CUATRO AULAS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de cuatro aulas de la Escuela Secundaria general Numero Obra en proceso. 222 Gral. Pedro María Anaya ubicado en Gral. Manuel Rincón s/n, Tlachaloya II Sección, Toluca, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 257 estudiantes.

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples PROGRAMA:

Localización: Gral. Manuel Rincón s/n, Tlachaloya II

Sección, Toluca, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,988,440.66

Ejercido 2019: \$1,965,955.11

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y reconstrucción de 4 aulas tipo Regional.



FICHA 434 **IMIFE**

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 26 115426-09 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de rehabilitación del plantel en la Escuela Preparatoria Obra en proceso. Oficial No. 26 ubicada en Privada de los Dólares s/n, Xalatlaco, México.

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Privada de los Dólares s/n, Xalatlaco,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,999,724.01

Ejercido 2019: \$1,972,543.67

Fecha de Inicio: 18/10/2019

26/12/2019 Fecha de Terminación:

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas (aplanados, pisos, pintura, instalación eléctrica, impermeabilización, puertas, cancelería) adecuación de área administrativa, rehabilitación de sanitarios (aplanados, pisos, salidas hidro-sanitarias y eléctricas, muebles sanitarios, mamparas, impermeabilización), andadores y rampas.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 365 estudiantes.



FICHA 435 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 297 115426-13 ELECTRIFICACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Electrificación del plantel con nombre Escuela Preparatoria Oficial No. Obra en proceso. 297 ubicada en la localidad de Rancho Sanabria, Rayón, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Rancho Sanabria, Rayón, México.

Costo de la Obra en 2019: \$898,167.77

Ejercido 2019: \$896,269.30

Fecha de Inicio: 04/11/2019

Fecha de Terminación: 28/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Electrificación del plantel construcción de registros, cableado y conexión de electricidad de la institución.



FICHA 436 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OFICIAL NO 0022 JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 114386-376 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA ADMINISTRATIVA 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción y equipamiento de área administrativa de la Escuela Obra en proceso. Secundaria General Oficial No 0022 José Ma. Morelos y Pavón ubicada en Capultitlán, Toluca, México

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 202 estudiantes.

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Capultitlán, Toluca, México.

Costo de la Obra en 2019: \$600,000.00

Ejercido 2019: \$180,000.00

Fecha de Inicio: 08/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de área administrativa EU1C.



FICHA 437 IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA FLORES MAGÓN 114386-205 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos en la Escuela Secundaria Técnica "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Antonio del Puente, Municipio de Temoaya, México.

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 623 alumnos

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: San Antonio del Puente, Municipio de

Temoaya, México.

Costo de la Obra en 2019: \$700,000.00

Ejercido 2019: 698,906.50

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de mesas de preparación de alimentos, instalación de red hidráulica, sanitaria y de gas.



FICHA 438 IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA POR TELEVISIÓN NO. 0135 RICARDO FLORES MAGON 114386-277 SUSTITUCIÓN DE TRES AULAS, MÓDULO DE SANITARIO Y DIRECIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL 020501010105

ANTECEDENTES

Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructural regional, en la Escuela Secundaria por Televisión 0135 "Ricardo Flores Magón", ubicada en Monte de Peña, Municipio de Villa del Carbón, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportación de Múltiples.

Localización: Monte de Peña, Municipio de Villa del

Carbón, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,401,748.69

Ejercido 2019: \$2388,013.97

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de 3 aulas y sanitarios, retiro de escombros, excavación, plantilla, zapatas corridas, muro de enrrase, castillos, cadenas y relleno de tepetate.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 350 alumnos



FICHA 439 **IMIFE**

CONALEP 198 HUIXQUILUCAN 115426-16 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación del plantel, en el CONALEP 198 Huixquilucan, ubicado en Calle Kilómetro 1.5 carretera a Zacamulpa, Municipio de Huixquilucan, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 144 alumnos

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Calle Kilómetro 1.5 carretera a Zacamulpa, Municipio de Huixquilucan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$193,033.00

Ejercido 2019: \$193,033.00

Fecha de Inicio: 30/09/2019

Fecha de Terminación: 28/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Instalación eléctrica, colocación de lámparas y cancelerías de aluminio.



FICHA 440 IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA VICENTE SUÁREZ 114386-379 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de barda perimetral, en Escuela Secundaria Técnica Vicente Suárez, ubicada en Enthavi 2ª Sección, Municipio de

Temoaya, México.

DATOS GENERALES Aproximadamente 237 alumnos

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Enthavi 2ª Sección, Municipio de

Temoaya, México.

Costo de la Obra en 2019: \$300,00.00

Ejercido 2019: \$90,000.00

Fecha de Inicio: 03/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Muro de contención de piedra brasa.



FICHA 441 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL NO. 95 ESTADO DE MÉXICO 114386-071 SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA 020501010105

ANTECEDENTES

Segunda etapa de la sustitución de barda perimetral y plaza cívica, en Escuela Secundaria Oficial No. 95 "Estado de México", ubicada en 85 Ciudad Satélite, Municipio de Naucalpan. México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: 85 Ciudad Satélite, Municipio de

Naucalpan. México.

Costo de la Obra en 2019: \$524,000.00

Ejercido 2019: \$522,732.53

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Firmes de concreto, demolición y sustitución de barda perimetral.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 475 alumnos



FICHA 442 IMIFE

SECUNDARIA GENERAL NO. 0091 "GUSTAVO A. VICENCIO" 114386-047 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de módulos sanitarios, en Escuela Secundaria General No. 0091 "Gustavo Vicencio", ubicada en 5 de Mayo y Gustavo Vicencio S/N, municipio a Xonacatlán.

Acción en proceso

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 800 alumnos

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: 5 de Mayo y Gustavo Vicencio S/N,

Municipio a Xonacatlán.

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$621,106.94

Fecha de Inicio: 18/09/2019

Fecha de Terminación: 16/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se colocó loseta, repellado de muros, rehabilitación de instalación sanitaria, construcción de meseta de lavabos, pintura en muro y plafón. En construcción rampa para personas con capacidades diferentes.



FICHA 443 IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD 114386-070 SUSTITUCIÓN DE CUATRO ESPACIOS AULA 020501010105

Acción por iniciar.

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de cuatro espacios aula, en la Escuela Secundaria General "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Taborda, Municipio de Temoaya, México.

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ejido de Taborda, Municipio de

Temoaya, México.

DATOS GENERALES

Costo de la Obra en 2019: \$2,192,022.49

Ejercido 2019: \$2,180,324.84

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición en proceso.

Aproximadamente 200 alumnos



FICHA 444 **IMIFE**

TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 129 TLATOANI 114386-373 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Construcción de barda perimetral y rehabilitación, en la Escuela Acción en proceso. Telesecundaria Federalizada No. 129 "Tlatoani", ubicada en Calle Veracruz No. 35, Col. México Nuevo, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Calle Veracruz No. 35, Col. México Localización:

Nuevo, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México.

Costo de la Obra en 2019: \$770,000.00

Ejercido 2019: \$769,092.16

Fecha de Inicio: 03/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Muro de contención de 2.5 m de alto, barda perimetral, desplante sobre la corona de la misma. En proceso colocación de firmes de concreto.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 241 alumnos



FICHA 445 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0022 BELISARIO DOMÍNGUEZ 114386-340 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de construcción de barda perimetral, rehabilitación y Obra en proceso. obra exterior de la E.S.T.A. No 0022 Belisario Domínguez ubicada en San Juan Atzingo, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 133 estudiantes.

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples PROGRAMA:

San Juan Atzingo, Ocuilan, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$140,000.00

Ejercido 2019: \$136,450.40

Fecha de Inicio: 12/08/2019

Fecha de Terminación: 10/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de aproximadamente 30 ml de barda y rehabilitación de obra exterior.



FICHA 446 IMIFE

SECUNDARIA MANUEL ESQUIVEL DURAN

114298-01 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, TALLER DE CÓMPUTO, TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, ÁREA ADMINISTRATIVA 02050101015

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Secundaria Manuel Esquivel Duran. Acción terminada.

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples Aproximadamente 500 alumnos.

Localización: Avenida Plutarco Elías Calles S/N

Costo de la Obra en 2019: \$486,786.00


Ejercido 2019: \$469,496.03

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aplanados, pintura, impermeabilizante, cancelaria, pisos de loseta, colocación de puertas.

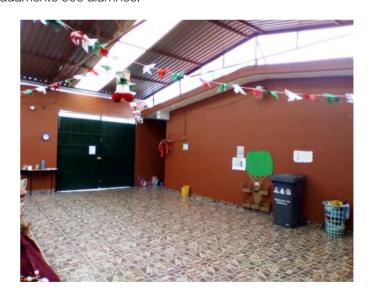

FICHA 447

SECUNDARIA TECNICA JUAN ALVAREZ 114298-02 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Secundaria Técnica Juan Álvarez en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Avenida Manuel Ávila Camacho S/N Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$568,784.00

Ejercido 2019: \$468,138.36

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de pintura, cancelaria, puertas, núcleo sanitario en edificio u-2c y edificio u1-c.



IMIFE

FICHA 448 IMIFE

SECUNDARIA SIMÓN BOLIVAR 114300-05 SEGUNDA ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 11 AULAS Y NÚCLEO SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Secundaria Simón Bolívar en el Municipio Acción terminada.

de Tonanitla

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Santa María Tonanitla

Costo de la Obra en 2019: \$6,198,100.00

Ejercido 2019: \$6,165,174.09

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Segunda etapa de la reconstrucción del edificio de 11 aulas y núcleo sanitario en estructura U2C.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 450 alumnos.



FICHA 449 IMIFE

SECUNDARIA TECNICA ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 56 JOSÉ ANTONIO TORRES 114300-06 ELECTRIFICACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Secundaria Técnica Escuela De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones 56 José

Antonio Torres en el Municipio de Ecatepec

BENEFICIOS GENERADOS

Acción terminada.

DATOS GENERALES Aproximadamente 400 alumnos.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Santa María Tulpetlac

Costo de la Obra en 2019: \$1,270,000.00

Ejercido 2019: \$1,263,547.89

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Suministro y colocación de impermeabilizante, retiro de impermeabilizante, albañilería.



FICHA 450 IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL 084 114301-08 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 DE AULAS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Preparatoria Oficial 084 en el Municipio de Acción terminada.

Axapusco Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Santo Domingo Aztecameca

Costo de la Obra en 2019: \$620,039.42

Ejercido 2019: \$599,949.34

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Segunda etapa de la construcción de 4 de aulas.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 451 IMIFE

PREPARATORIA NUMERO 251 114301-24 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Preparatoria Número 251 en el Municipio

De Teotihuacán Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: San Sebastian Xolalpa

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$649,324.47

Fecha de Inicio: 05/07/2019

Fecha de Terminación: 01/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cancelería, aplanados de barda perimetral pintura, puertas

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 452 **IMIFE**

SECUNDARIA NUMERO 0578 ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 114386-042 TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Numero 0578 Andrés Molina Acción terminada.

Enríquez en el Municipio de Ecatepec Estado de México

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples PROGRAMA:

Localización: Francisco Munguía s/n

Costo de la Obra en 2019: \$43,320.00

Ejercido 2019: \$40,651.69

Fecha de Inicio: 05/07/2019

Fecha de Terminación: 03/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

aplanados, pintura, cancelería Trabajos de aluminio. impermeabilización, cambio de muebles sanitarios e instalación hidrosanitaria.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 453 IMIFE

SECUNDARIA SIMÓN BOLÍVAR 114386-215 TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Simón Bolívar en el Municipio

de Tonanitla estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples 2019

Localización: Santa María Tonanitla

Costo de la Obra en 2019: \$5,199,888.73

Ejercido 2019: \$5,162,345.59 Fecha de Inicio: \$0/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior.

Acción en proceso

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 454 **IMIFE**

SECUNDARIA NUMERO 439 AQUILES SERDÁN 114386-219 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Numero 439 Aquiles Serdán en Acción terminada. el Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 PROGRAMA:

Localización: Jardines de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$3, 624,289.38

Ejercido 2019: \$3,615,880.69

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda Perimetral

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 750 alumnos.



FICHA 455 **IMIFE**

SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE 114386-226 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Ramón López Velarde en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Avenida México s/n Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$2,549,891.69

Ejercido 2019: \$2,538,725.81

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 456 **IMIFE**

SECUNDARIA TECNICA NUMERO 97 ANDRÉS HENESTROSA 114386-229 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Técnica Número 97 Andrés Acción terminada.

Henestrosa en el Municipio de Ecatepec

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples PROGRAMA:

Localización: Tultitlán s/n

Costo de la Obra en 2019: \$2,357,708.64

Ejercido 2019: \$2,349,280.71

Fecha de Inicio: 04/09/2019

Fecha de Terminación: 22/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda Perimetral

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 457 IMIFE

SECUNDARIA TECNICA OFICIAL NÚMERO. 0036 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 114386-234 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Secundaria Técnica Oficial número. 0036

Ignacio Manuel Altamirano

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$1,579,933.12

Ejercido 2019: \$1,569,240.67

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda Perimetral

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 458 **IMIFE**

TELESECUNDARIA No. 0758 "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 114386-303 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (5.30X6) 20501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de 3 aulas, sanitarios y obra exterior (5.30x6), en la Acción en proceso. Escuela Telesecundaria No. 0758 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en El Limón, Municipio de Tlatlaya, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 16 alumnos

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: El Limón, Municipio de Tlatlaya, México

Costo de la Obra en 2019: \$2,997,061.74

Ejercido 2019: \$2,942,580.15

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Corte de terreno y conformación y desplante de muros.



FICHA 459 IMIFE

SECUNDARIA TEPOCHTLICALLI 114386-269 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN (CO) 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Tepochtlicalli en Ecatepec Acción terminada.

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples Aproximadamente 300 alumnos.

Localización: Calle Sur 220, San Pedro Xalostoc

Costo de la Obra en 2019: \$600,000.00

Ejercido 2019: \$598,732.12

Fecha de Inicio: 31/07/2019

Fecha de Terminación: 28/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos en sanitarios de niños y niñas y laboratorio de química.



FICHA 460 IMIFE

SECUNDARIA AGRIPIN GARCÍA ESTRADA 114386-274 REHABILITACIÓN DE PLANTEL (CO) 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Secundaria Agripin García Estrada En El Acción terminada.

Municipio De Ecatepec Estado De México

BENEFICIOS GENERADOS DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$320,000.00

Ejercido 2019: \$266,811.60

Fecha de Inicio: 31/07/2019

Fecha de Terminación: 28/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de impermeabilización de 3 aulas, loseta en pisos y aplanados y pintura en barda perimetral.



FICHA 461 IMIFE

TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC 114386-305 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL (CO) 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc en el Acción terminada.

Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Kilómetro 13.5 Vía Morelos s/n

Costo de la Obra en 2019: \$2,759,324.11

Ejercido 2019: \$2,747,177.09

Fecha de Inicio: 01/11/2019

Fecha de Terminación: 30/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de 7 aulas con resanes en muro, pintura, instalación eléctrica, loseta, impermeabilización, andadores, losa en pasillos, reparación de presidium de ceremonias.





FICHA 462 IMIFE

SECUNDARIA NÚMERO 0462 15 DE SEPTIEMPRE 114386-127 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Secundaria Numero 0462 15 De septiembre en el Municipio de Ecatepec

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Venustiano Carranza s/n, Melchor

Muzquiz

Costo de la Obra en 2019: \$215,000.00

Ejercido 2019: \$ 212,653.55

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 23/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de sanitarios.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 463 IMIFE

TELESECUNDARIA NUMERO 0763 NUEVA CREACIÓN 114386-350 MÓDULO SANITARIO Y BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Telesecundaria Numero 0763 Nueva Creación en el Municipio de San Martín de las Pirámides

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: San Antonio de las Palmas

Costo de la Obra en 2019: \$1,696,128.89

Ejercido 2019: \$1,684,869.84

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Módulo sanitario y barda perimetral.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 300 alumnos.



FICHA 464 IMIFE

ANEXO A LA ESCUELA NORMAL DE ECATEPEC 114386-097 SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Anexo a la Escuela Normal De Ecatepec En Acción terminada.

El Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Avenida Hidalgo s/n

Costo de la Obra en 2019: \$2,198,099.79

Ejercido 2019: \$2,187,416.57

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de 3 Aulas

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 465 **IMIFE**

SECUNDARIA NUMERO. 0902 MARIANO AZUELA 114386-100 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Numero. 0902 Mariano Azuela Acción terminada.

en el Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Avenida México s/n

Costo de la Obra en 2019: \$1,599,859.74

Ejercido 2019: \$1,588,899.13

Fecha de Inicio: 30/08/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro de estructura de madera y rehabilitación de 6 aulas.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 466 **IMIFE**

SECUNDARIA OFICIAL. NUMERO. 0200 PROFESOR ROBERTO RUÍZ LLANOS 114386-206 PRIMERA ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Oficial. Numero. 0200 profesor Roberto Ruíz Llanos en el Municipio de Ecatepec estado de México

Acción terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Fondo de Aportaciones Múltiples PROGRAMA:

Localización: Santa Águeda Avenida de los Maestros s/n, Colonia

Costo de la Obra en 2019: \$350,631.29

Ejercido 2019: \$349,331.10

Fecha de Inicio: 11/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior.



FICHA 467 IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OFICIAL NUMERO 0928 GENERAL EMILIANO ZAPATA 114386-218 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 14 AULAS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de construcción de 14 aulas en la Escuela secundaria General Oficial Numero 0928 General Emiliano Zapata ubicada en Obra en proceso. Santiago Oxtotitlán, Villa Guerrero, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 160 estudiantes.

Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Santiago Oxtotitlán, Villa Guerrero,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$4,196,438.69

Ejercido 2019: \$4,195,850.44

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 27/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 468 **IMIFF**

TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA

114386-035 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE PISOS INTERIORES Y EXTERIORES, ASI COMO REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TRABES, COLUMNAS Y LOSAS, MUROS DE CARGA, MUROS DIVISORIOS, PINTURA Y CANCELERIA 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de rehabilitación de pisos interiores y exteriores, así como rehabilitación de barda perimetral, trabes, columnas y losas, Obra en proceso. muros de carga, muros divisorios, pintura y cancelería en la Telesecundaria Francisco Villa ubicada en Calle Independencia s/n, BENEFICIOS GENERADOS San Pedro Ejido Tecomatlán, Tenancingo, México.

TRABAJOS FJECUTADOS

Aproximadamente 480 estudiantes.

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Calle Independencia s/n, San Pedro

Ejido Tecomatlán, Tenancingo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$170,000.00

Ejercido 2019: \$ 161,446,41

Fecha de Inicio: 23/09/2019

Fecha de Terminación: 21/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de trabes y columnas de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 469 **IMIFE**

TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 114386-333 SEGUNDA ETAPA DE REPARACIÓN DE ACABADO EN MUROS CON MALLA Y MORTERO 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda etapa de reparación de acabado en muros con malla y Obra en proceso. mortero de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río en la localidad de Conocido, Agua Bendita, Tenancingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 160 estudiantes.

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Conocido, Agua Bendita, Tenancingo,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$435,000.00

Ejercido 2019: \$431,340.43

Fecha de Inicio: 12/08/2019

Fecha de Terminación: 09/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de trabes y columnas de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 470 **IMIFE**

TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL 114386-380 PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE AULAS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primera etapa de sustitución de aulas de la Telesecundaria Gabriela Obra en proceso. Mistral ubicada en San Mateo Coapexco, Villa Guerrero, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: San Mateo Coapexco, Villa Guerrero,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,730,000.00

Ejercido 2019: \$3,728,631.19

Fecha de Inicio: 04/11/2019

Fecha de Terminación: 28/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de trabes y columnas de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 471 IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL 202 CUAUHTÉMOC 115426-78 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS TIPO U2C 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Preparatoria Oficial 202 Cuauhtémoc en el Acción en proceso.

Municipio de Ecatepec estado de México

BENEFICIOS GENERADOS

Fondo de Aportaciones Múltiples 2019

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$420,000.00

Ejercido 2019: \$126,000.00

Fecha de Inicio: 06/06/2019

Fecha de Terminación: 03/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Segunda Etapa De La Construcción De Tres Aulas Tipo U2c.



FICHA 472 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 266

115426-81 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS TIPO REGIONAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Preparatoria Oficial No. 266 en el Municipio Acción terminada.

de Ecatepec estado de México

BENEFICIOS GENERADOS DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples 2019

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$1,707,549.86

Ejercido 2019: \$512,264.96

Fecha de Inicio: 19/12/2019

Fecha de Terminación: 30/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación y mantenimiento de aulas existentes y construcción de un módulo de sanitarios tipo regional.



FICHA 473 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0997 ESTADO DE MÉXICO 114386-181 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Secundaria Oficial Numero 0997 Estado De Acción en proceso. México en el Municipio de Ixtapaluca Estado De México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 400 alumnos.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples 2019

Localización: Avenida Washingtonia s/n

Costo de la Obra en 2019: \$600,000.00

Ejercido 2019: \$596,009.47

Fecha de Inicio: 24/07/2019

Fecha de Terminación: 21/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de Sanitarios



FICHA 474 IMIFE

PREPARATORIA 229 115426-39 TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Preparatoria 229 En El Municipio De Acción en proceso.

Tecámac Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Tecámac de Felipe Villanueva

Costo de la Obra en 2019: \$392,734.2

Ejercido 2019: \$392,734.2

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de Laboratorio de Cómputo.

THE ROOT LOLGOTT ROOT

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 600 alumnos.



FICHA 475 IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO. 208 115426-73 TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Preparatoria Oficial No. 208 en el Municipio Acción en proceso

de Axapusco estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples

Localización: Santa María Actipan

Costo de la Obra en 2019: \$600,000.00

Ejercido 2019: \$600,000.00

Fecha de Inicio: 22/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación De Mantenimiento General.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 476 **IMIFE**

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 128 115426-74 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS U-1C 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Preparatoria Oficial No. 128 En El Municipio Acción en proceso

De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

Fondo de Aportaciones Múltiples. PROGRAMA:

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$1,598,369.13

Ejercido 2019: \$1,598,369.13

Fecha de Inicio: 19/12/2019

Fecha de Terminación: 30/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción y equipamiento de 2 Aulas Didácticas U-1c.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 477 IMIFF

TELESECUNDARIA LICENCIADO ALVARO GALVÉZ Y FUENTES

114386-322 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PLANTA ALTA, TERMINACIÓN DE ESCALERA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR

20501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, Obra en proceso. rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior de la Telesecundaria Licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes ubicada en BENEFICIOS GENERADOS Solidaridad, El Salitre, Tenancingo, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Solidaridad, El Salitre, Tenancingo,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,749,279.89

Ejercido 2019: \$2,749,279.89

Fecha de Inicio: 13/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.

Aproximadamente 240 estudiantes.



FICHA 478 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL 0293 "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" 112356 REHABILITACIÓN DE 3 AULAS DEL EDIFICIO B 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de 3 aulas del edificio B, en la Escuela Secundaria Oficial 0293 "José Clemente Orozco", ubicada en San Miguel Zinacausto, Municipio de Amatepec, México

BENEFICIOS GENERADOS

Acción terminada.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: San Miguel Zinacausto, Municipio de

Amatepec, México

Costo de la Obra en 2019: \$155,032.27

Ejercido 2019: \$151,331.87

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 3 aulas U-1C, cancelería, pintura e

impermeabilizante.



FICHA 479 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL POR TELEVISIÓN No 0159 "LÁZARO CARDENAS" 111849 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No 0159 "Lázaro Cárdenas", ubicada en Cañadas de Nanchititla, Municipio de Luvianos, México

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 50 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Cañadas de Nanchititla, Municipio de

Luvianos, México

Costo de la Obra en 2019: \$56,623.42

Ejercido 2019: \$54,767.42

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 05/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula tipo regional, instalación eléctrica, pintura e impermeabilizante.



FICHA 480 **IMIFE**

SECUNDARIA OFICIAL No 0406 "EMETERIO GONZÁLES" 111946 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria oficial No 0406 "Emeterio Acción en proceso. Gonzáles", ubicada en San Andrés de los Gama, Municipio de Temascaltepec, México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 50 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

San Andrés de los Gama, Municipio de Localización:

Temascaltepec, México

Costo de la Obra en 2019: \$55,975.09

Ejercido 2019: \$54,135.67

17/08/ 2019 Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Excavación para cimentación de un aula.



FICHA 481 **IMIFE**

SECUNDARIA "NIÑOS HÉROES" 112244 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria "Niños Héroes", ubicada en Acción terminada.

Santa Cruz, Municipio de Luvianos, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Santa Cruz, Municipio de Luvianos,

México

Costo de la Obra en 2019: \$85,355.35

Ejercido 2019: \$84,864.09

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 9 módulos de barda perimetral.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 150 alumnos



FICHA 482 **IMIFE**

SECUNDARIA OFICIAL POR TELEVISIÓN No 0322 "JOAQUIN VELÁZQUEZ DE LEÓN" 111788 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria oficial No. 0322 "Joaquín Acción en proceso. Velázquez de León", ubicada en Coloxtitlán, Municipio de Zacualpan, México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 77 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Coloxtitlán, Municipio de Zacualpan, Localización:

México

Costo de la Obra en 2019: \$37,557.48

Ejercido 2019: \$35,447.44

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de piso cerámico



FICHA 483 **IMIFE**

SECUNDARIA OFICIAL POR TELEVISIÓN No. 0704 "PROGRESO" 111957 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria oficial por televisión No. Acción por iniciar. 0704 "Progreso", ubicada en Cruz de Quijote, Municipio de Zacualpan, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Cruz de Quijote, Municipio de Zacualpan,

México

Costo de la Obra en 2019: \$500,000.00

Ejercido 2019: \$494,273.66

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

No se ha presentado empresa contratista.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 30 alumnos



FICHA 484 **IMIFE**

SECUNDARIA OFICIAL POR TELEVISIÓN No. 0524 GRAL. "EMILIANO ZAPATA" 112048 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Secundaria Oficial por televisión No. 0524 Gral. Acción terminada. "Emiliano Zapata", ubicada en El Relevado, Municipio de Tlatlaya, México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

El Relevado, Municipio de Tlatlaya, Localización:

México

Costo de la Obra en 2019: \$51,836.04

Ejercido 2019: \$50,270.04

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación, pintura, resanado de grietas, rehabilitación de cancelería.



FICHA 485 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL POR TELEVISIÓN No. 0570 "JOSÉ MA. MORELOS" 111851 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Secundaria Oficial por televisión No. 0570 "José Ma. Morelos", ubicada en Cerro del Venado, Municipio de Luvianos, México

BENEFICIOS GENERADOS

Acción en proceso.

DATOS GENERALES Aproximadamente 100 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Cerro del Venado, Municipio de Luvianos

Costo de la Obra en 2019: \$49,807.19

Ejercido 2019: \$48,876.34

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de 2 aulas, aplanados, loseta, instalación eléctrica, cancelería, puertas, ventanas.



FICHA 486 **IMIFE**

PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 131 112016 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Preparatoria Oficial Número 131, ubicada en Acción terminada. Almoloya de las Granadas, Municipio de Tejupilco, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Almoloya de las Granadas, Municipio de Localización:

Tejupilco, México

Costo de la Obra en 2019: \$49.041.66

Ejercido 2019: \$47,950.33

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de un aula, aplanados, instalación eléctrica, construcción de sanitarios atípicos.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 50 alumnos



FICHA 487 **IMIFE**

SECUNDARIA No. 0056 "ROQUE DÍAZ" 112267 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Secundaria No. 0056 "Roque Díaz", ubicada en Acción terminada. Zacualpan, Municipio de Zacualpan, México

DATOS GENERALES

Localización:

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 227 alumnos

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Zacualpan, Municipio de Zacualpan, México

Costo de la Obra en 2019: \$177,857.57

Ejercido 2019: \$173,876.45

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de piso cerámico en aula y laboratorio, pintura en muros, plafón y trabes, así como la colocación de salidas eléctricas para luminarias.



FICHA 488 **IMIFE**

SECUNDARIA No. 0341 "BENITO JUÁREZ" 112309 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria No. 0341 "Benito Juárez", Acción en proceso. ubicada en Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya, México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya,

México

Costo de la Obra en 2019: \$750,000.00

Ejercido 2019: \$747,884.16

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula tipo regional, barda perimetral y andador.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 21 alumnos



FICHA 489 **IMIFE**

SECUNDARIA No. 0160 "LAURA MÉNDEZ DE CUENCA" 112248 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria No. 0160 "Laura Méndez de Acción en proceso."

Cuenca", ubicada en Caja Agua, Municipio de Luvianos, México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Caja Agua, Municipio de Luvianos,

México

Costo de la Obra en 2019: \$15,830.85

..8

\$15,503.47 Ejercido 2019:

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 23/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de muro en 2 aulas, pintura, cancelería y loseta.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 50 alumnos



FICHA 490 **IMIFE**

ESCUELA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS "JOSEFA ORTIZ DOMÍNGUEZ" 112103 CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de un aula y obra exterior, en la Escuela Educación Acción terminada. para los Adultos "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente alumnos

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Villa Luvianos, Municipio de

Luvianos, México

Costo de la Obra en 2019: \$30,914.41

Ejercido 2019: \$29,460.80

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de andador y barda perimetral



FICHA 491 IMIFE

ESCUELA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS "EMILIANO ZAPATA" 112358 REHABILITACIÓN DE 3 AULAS DEL EDIFICIO "C" 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de 3 aulas del edificio "C", en la Escuela Educación para los Adultos "Emiliano Zapata", ubicada en Santiago, Municipio de Amatepec, México

Acción terminada

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 50 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Santiago, Municipio de Amatepec,

México

Costo de la Obra en 2019: \$49,615.98

Ejercido 2019: \$47370.21

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula tipo regional, pintura.



.

FICHA 492 IMIFE

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO NUMERO 2 SULTEPEC

112237 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de 3 Aulas, Servicios Sanitarios, Laboratorio de Usos Acción en proceso. Múltiples, Taller de Cómputo y Obra Exterior, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Numero 2 Sultepec, ubicada en BENEFICIOS GENERADOS

Potzontepec, Municipio de Sultepec, México

Aproximadamente 32 alumnos

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Potzontepec, Municipio de Sultepec,

México

Costo de la Obra en 2019: \$1,043,476.63

Ejercido 2019: \$1,040,222.81

Fecha de Inicio: 03/09/ 2019

Fecha de Terminación: 01/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción y pintura de barda perimetral, obra exterior,



FICHA 493 **IMIFE**

COBAEM PLANTEL 58 115123 TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA 020502010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de suministro de energía eléctrica, en el COBAEM Obra terminada. Plantel 58; ubicado en Loma de Malacota, Municipio de Jiguipilco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el

Localización: Loma de Malacota, Jiquipilco.

Costo de la Obra en 2019 : \$589,073.01

Ejercido 2019: \$589,073.01

Fecha de Inicio: 27/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acercamiento de la línea eléctrica, colocación del transformador dejando preparación de la instalación para su posterior alimentación por parte de la Comisión federal de Electricidad.



FICHA 494 IMIFE

CBT CHAPA DE MOTA (AGM-173) 115124 TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 020502010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de suministro de energía eléctrica, en el CBT Chapa de Mota (AGM-173); ubicado en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, México.

Obra terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 200 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Macavaca, Chapa de Mota.

Costo de la Obra en 2019: \$572,073.01

Ejercido 2019: \$572,073.01

Fecha de Inicio: 27/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acercamiento de la línea eléctrica, colocación del transformador dejando preparación de la instalación para su posterior alimentación por parte de la Comisión federal de Electricidad.



FICHA 495 IMIFE

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN EXTENSIÓN ACULCO (AGM-18) 115140 TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 020503010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de suministro de energía eléctrica, en el Tecnológico de Estudios superiores de Jocotitlán extensión Aculco (AGM-18), ubicado en Aculco de Espinoza, Municipio de Aculco, México.

Obra terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: Aculco de Espinoza, Aculco.

Costo de la Obra en 2019: \$733,427.64

Ejercido 2019: \$733,427.64

Fecha de Inicio: 27/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acercamiento de la línea eléctrica, colocación del transformador dejando preparación de la instalación para su posterior alimentación por parte de la Comisión federal de Electricidad.



FICHA 496 **IMIFE**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN 115135 TRABAJOS ADICIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO, OBRA EXTERIOR 020503010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos adicionales de la construcción del centro de cómputo, obra exterior, en el Tecnológico de estudios superiores de Jocotitlán; ubicado en San Agustín (Jocotitlán), Municipio de Jocotitlán.

Obra terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

San Agustín (Jocotitlán), Jocotitlán. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$2,294,756.35

Ejercido 2019: \$2,293,558.23

Fecha de Inicio: 14/12/2019

Fecha de Terminación: 30/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Suministro de la red eléctrica para darle alimentación al centro de cómputo.



FICHA 497 **IMIFE**

SECUNDARIA TÉCUNDARIA JUAN RODRÍGUEZ PUEBLA 112130 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Técnica Juan Rodríguez Obra terminada. Puebla, ubicada en Ioma de Hidalgo, Municipio de Jiguipilco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: Loma de Hidalgo, Jiquipilco.

Costo de la Obra en 2019 : \$105,186.09

Ejercido 2019: \$105,390.57

Fecha de Inicio: 03/09/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y construcción de edificio afectado, colocación de impermeabilizante, demolición y construcción del muro que se encontraba separado y ejecución de la construcción de barda perimetral.



FICHA 498 IMIFE

OFIC No 0553 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 111757 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación, en Escuela Secundaria General Ofic No 0553 Lic. Adolfo López Mateos; ubicada en El Capulín (barrio El capulín La Loma), Municipio de Acambay, México.

Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 100 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: El Capulín (Barrio El Capulín La Loma)

Acambay.

Costo de la Obra en 2019: \$500,000.00

Ejercido 2019: \$496,918.46

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 04/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Ejecución de trabajos en cimentación, muro de enrace, firme de concreto, construcción de muros de tabique rojo, aplanado en muros, construcción de losa de azotea y construcción de módulo de tinacos.



FICHA 499 **IMIFE**

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 155 112151 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN 020502010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Rehabilitación, en la Escuela Preparatoria Oficial Obra terminada.

Núm. 155; ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: La Jordana, El Oro.

Costo de la Obra en 2019: \$1,109,952.09

Ejercido 2019: \$1,109,325.70

Fecha de Inicio: 04/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Desmontaje de cancelería existente y colocación de cancelería de aluminio, rehabilitación de la Instalación eléctrica y sustitución de piso de loseta.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 alumnos.



FICHA 500 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 71 112241 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN 020502010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Rehabilitación, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 71; ubicada en Santa Isabel, Municipio de Jiquipilco, México.

Obra terminada.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo

Localización: Santa Isabel, Jiquipilco.

Costo de la Obra en 2019: \$67,218.36

Ejercido 2019: \$60,481.08


Fecha de Inicio: 10/08/ 2019

Fecha de Terminación: 07/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Colocación de impermeabilizante del edificio en el plantel.

Aproximadamente 150 alumnos.

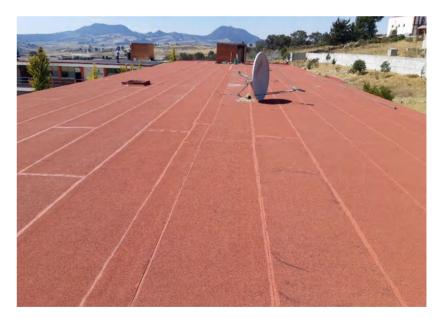

FICHA 501 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL NO 0167 PROFESOR FILIBERTO NAVAS VALDÉS 112133 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 020501010105

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra con un avance del 10%

Rehabilitación de Edificios en la Secundaria Oficial No 0167 Profesor Filiberto Navas Valdés en Joquicingo de León Guzmán, Joquicingo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 208 estudiantes

DATOS GENERALES

ANTECEDENTES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Joquicingo de León Guzmán,

Joquicingo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$4,493,772.00

Ejercido 2019: \$4,484,648.60

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se colocaron 64 placas conmemorativas y de inauguración en 30 municipios del Estado de México, en las diversas obras y acciones realizadas en el ejercicio fiscal.



FICHA 502 **IMIFE**

ESCUELA TELESECUNDARIA NO 0317 JOSÉ MARÍA VELASCO 112140 REHABILITACIÓN DE AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas, Dirección y Sanitarios en la Escuela Acción terminada. Telesecundaria No 0317 José María Velasco, Santa Lucía, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 82 estudiantes.

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Localización: Santa Lucía, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,860,594.56

Ejercido 2019: \$1,856,882.56

Fecha de Inicio: 25/07/ 2019

Fecha de Terminación: 22/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de cinco Aulas y servicios Sanitarios que consta de muros de tabique rojo recocido, aplanados, instalación eléctrica, pisos de loseta impermeabilizante, pintura, cancelería, puertas, todo el mobiliario sanitario y barda perimetral



FICHA 503

COLEGIO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO STEVE JOBS, JOQUICINGO 112258 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR 020501010105 TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aulas y Obra Exterior en CBT Steve Jobs, Obra en proceso. Joquicingo, Joquicingo de León Guzmán, México.

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Joquicingo de León Guzmán, México.

Costo de la Obra en 2019: \$4,881,857.00

Ejercido 2019: \$4,871,463.98

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

ANTECEDENTES

DATOS GENERALES

Estructura U-2C, zapatas corridas y contratrabes de concreto armado, muros de concreto, trabes, columnas y losa de concreto armado, muros divisorios de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, lámparas, andadores. Rehabilitación de área administrativa (entortado e impermeabilizante, aplanados, pintura en general)



FICHA 504 IMIFE

TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS TELESECUNDARIA NO. 315 114210 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel en la Telesecundaria José Vasconcelos

Telesecundaria No. 315, Pastoría, Ocuilan, México.

Obra en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 74 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Pastoría, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$450,000.00

Ejercido 2019: \$448,436.31

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas (entortado e impermeabilización de losa, pintura en muros y plafones)



FICHA 505 IMIFE

CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 07 SAN JUAN ATZINGO 114215 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel en el Centro de Educación Media Superior a Obra en proceso.

Distancia 07 San Juan Atzingo, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 97 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: San Juan Atzingo, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$750,000.00

Ejercido 2019: \$744,640.80

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

DATOS GENERALES

Rehabilitación de aulas (entortado e impermeabilización de losa, colocación de loseta cerámica, pintura en muros y plafones), rehabilitación de sanitarios (impermeabilización, colocación de piso de loseta cerámica y lambrin en muros, pintura en muros y plafones)



FICHA 506 IMIFE

SECUNDARIA TECNICA CARLOS FUENTES 111763 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de la Secundaria Técnica Carlos Fuentes, Ex-Rancho San Dimas, San Antonio La Isla, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Ex-Rancho San Dimas, San Antonio La

Isla, México.

Costo de la Obra en 2019: \$100,298.22

Ejercido 2019: \$96,180.22

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de barda perimetral, rehabilitación de sanitarios, así como colocación de luminarias, cambio de muebles sanitarios, retiro y colocación de azulejo, aplicación de pintura en sanitarios. Aplicación de pintura exterior e interior en todos los edificios del plantel, colocación de luminarias.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 5 mil habitantes



FICHA 507 IMIFE

SECUNDARIA TECNICA CAUDILLOS DEL SUR 111860 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de la Secundaria técnica Caudillos del Sur, Chalmita,

Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Chalmita, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$39,881.78

Ejercido 2019: \$38,293.73

Fecha de Inicio: 22/02/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de barda perimetral y construcción de la barda perimetral, acabado con pintura.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 138 estudiantes.



FICHA 508 IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OFICIAL NO 0049 JUSTO SIERRA MÉNDEZ 112487 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel de la Escuela Secundaria General Ofic. No 0049 Justo Sierra Méndez, Ocuilan de Arteaga, Ocuilan, México

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 371 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Ocuilan de Arteaga, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$271,943.04

Ejercido 2019: \$271,034.93

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 11 Aulas y servicios sanitarios con estructura U-2C.



FICHA 509 IMIFE

TELESECUNDARIA LA PASTORIA 114208 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105 TRABAJOS EJECUTADOS

ANTECEDENTES

Rehabilitación del Plantel Telesecundaria La Pastoría en Ocuilan de Obra en proceso. Arteaga, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

PROGRAMA:

Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Ocuilan de Arteaga, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$450,000.00

Ejercido 2019: \$448,350.37

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 17/03/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de instalación eléctrica, impermeabilizante, portón de acceso, andadores



FICHA 510 **IMIFF**

TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ 112119 SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚI TIPI FS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Sustitución de Impermeabilizante y Sustitución de Cancha de Usos Obra en proceso. Múltiples de la Telesecundaria Moisés Sáenz en Toluca de Lerdo, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 134 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Toluca de Lerdo, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$59,095.02

Ejercido 2019: \$55,331.68

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de instalación eléctrica, firmes de concreto, falta sustitución de cancelería de aluminio.



FICHA 511 **IMIFF**

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0450 JUAN ESCUTIA 112481 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación de la Escuela Secundaria Oficial Obra en proceso. Numero 0450 Juan Escutia en Santa Martha, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el Desarrollo. Aproximadamente 550 estudiantes. PROGRAMA:

Localización:

Santa Martha, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$749.615.03

Ejercido 2019: \$746,576.99

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Estructura U-2C, zapatas corridas y contratrabes de concreto armado, muros de concreto, trabes, columnas y losa de concreto armado, muros divisorios de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, lámparas, andadores.



FICHA 512 IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA LIBERTADORES DE AMÉRICA 112391 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Primer Etapa de Rehabilitación en la Escuela Secundaria Técnica Libertadores de América ubicada en Ocuilan de Arteaga, Ocuilan, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Ocuilan de Arteaga, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$398,946.22

Ejercido 2019: \$397,096.01

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de cuatro aulas estructura U-1C.

TRABAJOS EJECUTADOS

Obra con un avance del 85%

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 461 estudiantes.



FICHA 513 **IMIFF**

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 149 112368 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de la Construcción de Aulas en el Telebachillerato Acción terminada. Comunitario 149 ubicado en la comunidad de Ahuatenco, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 200 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Ahuatenco, Ocuilan, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$391,986.89

Ejercido 2019: \$390,136,69

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Estructura regional, zapatas corridas de concreto armado, enrases de block, muros de tabique rojo, cadenas, castillos, losa de concreto armado, muros de tabique rojo, aplanados de mortero acabado fino, castillos, cadenas, pisos de loseta cerámica, pintura vinílica, cancelería de aluminio de 2", puerta de acero galvanizado, azulejo, mamparas de láminas, azulejo, lámparas v andadores.



FICHA 514 **IMIFF**

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 150

112432 TERMINACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE 12 AULAS, ESCALERAS Y SANITARIOS, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Sustitución de 12 Aulas, Escaleras y Sanitarios así Obra con un avance del 99% como Construcción de Barda Perimetral en el Telebachillerato Comunitario 150 ubicado en la localidad de Santa Cruz Tezontepec. BENEFICIOS GENERADOS Ocuilan, México.

Aproximadamente 183 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Santa Cruz Tezontepec, Ocuilan,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$402,261.71

Ejercido 2019: \$398,962.67

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 12 Aulas, Escaleras y Sanitarios.



FICHA 515 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0175 HERMANOS FLORES MAGÓN 112040 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel de la Escuela secundaria Oficial No 0175 Acción terminada. Hermanos Flores Magón ubicada en Calixtlahuaca, Toluca, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 464 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Calixtlahuaca, Toluca, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$64,994.58

Ejercido 2019: \$64,994.58

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de instalación eléctrica, impermeabilizante y sustitución de luminarias.



FICHA 516 **IMIFF**

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 1006 SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN 112065 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda Etapa de la Rehabilitación de la Escuela Secundaria General Acción terminada. Numero 1006 Sentimientos de la Nación ubicada en Toluca de Lerdo. México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 199 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Localización: Toluca de Lerdo, México.

Costo de la Obra en 2019: \$47,298.73

Ejercido 2019: \$45,690.97

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Aplicación de aplanados, pintura y colocación de loseta en módulo de 5 aulas, impermeabilización, cancelería y puertas.



FICHA 517 IMIFF

CONALEP PLANTEL GUSTAVO BAZ NO.006

115113 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA 0205010105

ANTECEDENTES

Terminación de la construcción de un módulo de sanitarios, barda perimetral y colocación de concertina, en CONALEP Plantel "Gustavo Baz" No. 006, ubicado en Barrientos, municipio de Tlalnepantla, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Barrientos, municipio de Tlalnepantla,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$691.741.14

Eiercido 2019: \$691,741.14

Fecha de Inicio: 28/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/19

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un módulo de sanitarios, en estructura EU-2C, construcción de barda perimetral.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 850 alumnos



FICHA 518 IMIFF

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA 115134 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO DE DOS NIVELES 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de la construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles, en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tlalnepantla, México.

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 800 alumnos

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Cabecera Municipal, Municipio de

Tlalnepantla, México.

Costo de la Obra en 2019: \$2,141,264.33

Ejercido 2019: \$2,141,264.33

Fecha de Inicio: 17/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Firmes de concreto, loseta en piso, cancelería de aluminio, instalación hidrosanitaria y aplicación de pintura en total del edificio.



FICHA 519 IMIFF

ESCUELA TELESECUNDARIA NO 0169 HORACIO ZÚÑIGA 112254 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN. 020501010105

Obra en proceso.

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Segunda Etapa de la Rehabilitación en la Escuela Telesecundaria No 0169 Horacio Zúñiga, San José, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: San José, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$391,388.85

Ejercido 2019: \$387,024.92

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

DATOS GENERALES

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de trabes y columnas de concreto armado.



FICHA 520 **IMIFE**

ANEXO A LA NORMAL DE SANTIAGO TIANGUISTENCO. 112168 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Anexo a la Normal de Santiago Tianguistenco, Obra en proceso. Santiago Tianguistenco de Galeana Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 235 estudiantes

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Santiago Tianguistenco de Galeana Localización:

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$19,284.27

Ejercido 2019: \$17,197.55

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 22/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Impermeabilización en aulas, demolición de muro para habilitado de bodega y área administrativa.



FICHA 521 IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0278 JUAN JACOBO ROUSSEAU 112506 PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en la Escuela Secundaria Oficial Acción terminada. Numero 0278 Juan Jacobo Rousseau de la comunidad de

Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita), Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 105 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita),

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$153,387.87

Ejercido 2019: \$147,405.75

Fecha de Inicio: 25/07/ 2019

Fecha de Terminación: 22/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación en área administrativa (impermeabilización, cancelería, aplanados, loseta, firme)



FICHA 522 **IMIFF**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL SANTIAGO TILAPA 112523 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en el CONALEP Estado de México Acción terminada. Plantel Santiago Tilapa, ubicado en la comunidad de Santiago Tilapa, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 510 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Santiago Tilapa, Tianguistenco, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$53,583.58

Ejercido 2019: \$50,252.52

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Retiro de impermeabilizante en mal estado, colocación de impermeabilizante prefabricado, colocación de luminarias y puertas en aulas.



FICHA 523 **IMIFF**

TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0579 XILONEN 112165 MÓDULO DE ESCALERA 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Realización del Módulo de Escalera en la Telesecundaria Oficial Obra en proceso. Numero 0579 Xilonen ubicada en la localidad de La Magdalena de los Reyes, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 184 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: La Magdalena de los Reyes,

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,032,851.12

Ejercido 2019: \$1,026,406.16

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de módulo de escalera, construcción de barda perimetral, rehabilitación de aulas aplanados, pintura impermeabilización, rehabilitación de herrería)



FICHA 524 **IMIFE**

TELESECUNDARIA SAN JOSÉ LOS RANCHOS 112463 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

TRABAJOS EJECUTADOS **ANTECEDENTES**

Primer Etapa de Rehabilitación de la Telesecundaria San José Los Acción terminada. Ranchos ubicada en la localidad de Los Ranchos de San José, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 200 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo. PROGRAMA:

Los Ranchos de San José, Villa Localización:

Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$183.157.20

Ejercido 2019: \$181,307.00

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 525 IMIFF

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 244 COAMILPA DE JUÁREZ 111429 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Edificios del Telebachillerato Comunitario Núm. 244 Obra en proceso. Coamilpa de Juárez, Tianguistenco, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 257 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Coamilpa de Juárez, Tianguistenco,

México.

Costo de la Obra en 2019: \$1,540,000.00

Ejercido 2019: \$1,523,785.31

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Se realizaron trabajos de rehabilitación de barda perimetral y construcción de módulos sanitarios.



FICHA 526 IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 111856 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Secundaria Técnica Sor Juana Inés de la Acción terminada. Cruz Municipio de Tultitlan Estado de México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 500 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: San Pablo de las Salinas

Costo de la Obra en 2019: \$690,197.60

Ejercido 2019: \$681,897.33

Fecha de Inicio: 25/07/ 2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de elementos estructurales de concreto de 10 edificios u2-c, desmontaje de cancelería e instalaciones eléctricas.



FICHA 527 IMIFE

SECUNDARIA BENITO JUÁREZ 112295 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Secundaria Benito Juárez Municipio de Zumpango Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Zumpango de Ocampo

Costo de la Obra en 2019: \$529,735.14

Ejercido 2019: \$529,109.64

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y construcción de un módulo de 4 aulas así como módulo de 2 aulas y 1 aula de usos múltiples.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 750 alumnos.



FICHA 528 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL 0304 LUIS DE VELAZCO 112385 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Of. 0304 Luis de Velazco Municipio de

Zumpango Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Santa María Cuevas

Costo de la Obra en 2019: \$958,028.31

Ejercido 2019: \$953,160.64

Fecha de Inicio: 25/07/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un edificio u2-c de 10 aulas y construcción de barda perimetral.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 529 IMIFE

CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGÍCO JAIME KELLER TORRES 115112 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UNA CAFETERÍA PARA 90 COMENSALES ESTRUCTURA U-1C 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela CBT Jaime Keller Torres Municipio de Acción terminada.

Huehuetoca Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: San Martín

Costo de la Obra en 2019: \$703,588.37

Ejercido 2019: \$703,588.37

Fecha de Inicio: 28/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de la construcción de la primera etapa de una cafetería para 90 comensales estructura U-1C.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 350 alumnos.



FICHA 530 IMIFE

SECUNDARIA LUIS GUEVARA RAMÍREZ 111799 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Secundaria Luis Guevara Ramírez Acción terminada.

Municipio de Cuautitlán Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán

Costo de la Obra en 2019: \$185,902.07

Ejercido 2019: \$183,944.68

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de pintura, cancelería, puertas, núcleo sanitario en Edificio U-2c Y Edificio U1-C.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 600 alumnos.



FICHA 531 IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA 0531 EMILIANO ZAPATA 112298 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación Secundaria Técnica 0531 Emiliano Zapata. Acción terminada.

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Aproximadamente 400 alumnos.

Desarrollo.

Localización: San Pablo de las Salinas

Costo de la Obra en 2019: \$139,837.33

Ejercido 2019: \$136,296.43

Fecha de Inicio: 03/09/ 2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aplanados, colocación de pisos de loseta, pintura, demoliciones de pisos.



FICHA 532 **IMIFE**

SECUNDARIA FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ DE TAGLE 111756 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela Sor Juana Inés de la Cruz Municipio de Acción terminada.

Tultitlan Estado de México.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: San Pablo de las Salinas

Costo de la Obra en 2019: \$1,500,000.00

Ejercido 2019: \$1,497,875.05

Fecha de Inicio: 18/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de la obra.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 440 alumnos.



FICHA 533 IMIFE

SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0021 CALMECAC 112015 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación En Escuela Secundaria Oficial Numero 0021

Calmecac.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$112,399.94

Ejercido 2019: \$109,342.45

Fecha de Inicio: 10/08/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Suministro y colocación de impermeabilizante, retiro de impermeabilizante, albañilería.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 534 IMIFE

SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA 112097 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación En Secundaria Técnica Federalizada, ubicada en Zumpango, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Zumpango

Costo de la Obra en 2019: \$99,104.57

Ejercido 2019: \$94,671.06

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha de Terminación: 29/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aplanados, pintura, colocación de loseta de cerámica, limpieza.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 535 **IMIFE**

SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS 112096 REHABILITACIÓN DE AULAS 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela José Vasconcelos Municipio de Cuautitlán Acción terminada.

Izcalli Estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Cuautitlán Izcalli

Costo de la Obra en 2019: \$167,072.00

Ejercido 2019: \$164,960.77

Fecha de Inicio: 10/07/2019

Fecha de Terminación: 07/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de pintura, colocación de piso de cerámica, colocación de cerámica.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 536 IMIFE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

115139 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE 3 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y 3 CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la Construcción de la Primera Etapa de 3 Canchas de Usos Múltiples y 3 Canchas de Futbol Rápido, en la universidad politécnica del valle de Toluca, ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Municipio Almoloya de Juárez.

Costo de la Obra en 2019: \$3, 395,843.88

Ejercido 2019: \$3,392,011.83

Fecha de Inicio: 14/11/2019

Fecha de Terminación: 30/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de dos canchas de usos múltiples, con firme de concreto fc=150kg/cm2 con malla electrosoldada, rehabilitación de vestidores de cancha de futbol rápido, construcción de fosa séptica y pozo de absorción.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 350 alumnos.



FICHA 537 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 249 112240 TERMINACION DE REHABILITACION 020401010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Rehabilitación, en la Preparatoria Oficial No. 249, ubicado en San Diego Suchitepec, municipio de Villa Victoria, México.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de Villa Victoria

Costo de la Obra en 2019: \$66,242.80

Ejercido 2019: \$64,555.29

Fecha de Inicio: 17/08/2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

PROGRAMA:

Terminación de rehabilitación eléctrica, cableado, luminarias, muro de acometida.



FICHA 538 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 247 112243 TERMINACION DE LA REHABILITACION 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de Rehabilitación, en la escuela preparatoria oficial No. 247 ubicado en San Marcos de la Loma, municipio de Villa Victoria, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Municipio de Villa Victoria.

Costo de la Obra en 2019: \$56,067.51

Ejercido 2019: \$52,36.92

Fecha de Inicio: 15/10/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación general del plantel, aplanados, pintura, pisos, luminarias, entortados, impermeabilizante.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción en proceso.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 107 alumnos.



FICHA 539 IMIFE

PREPARATORIA OFICIAL NO. 249 115116 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 020501010105

ANTECEDENTES

Terminación de la Construcción de 2 Aulas, en la Preparatoria Oficial No. 249, ubicada en San Diego Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Municipio de villa victoria.

Costo de la Obra en 2019: \$87,474.17

Ejercido 2019: \$87,474.17

Fecha de Inicio: 28/11/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de dos aulas en estructura U-1c, Zapatas de concreto corridas y contratrabes de concreto, columnas, trabes, y losa de concreto, colocación de loseta, pintura en plafónd, muros, columnas, y trabes, herrería de aluminio, impermeabilización, prefabricado SBS.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción cancelada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 120 alumnos.



FICHA 540 IMIFE

SECUNDARIA 52 EHÉCATL 111750 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación de Edificios Secundaria 52 Ehécatl en el Municipio de

Ecatepec.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: La Estrella

Costo de la Obra en 2019: \$5,376,494.35

Ejercido 2019: \$5,364,044.91

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 21/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de aplanados, pintura, cancelería de aluminio e impermeabilización.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Acción terminada.

Aproximadamente 750 alumnos.



FICHA 541 **IMIFE**

SECUNDARIA EMMA GOLDMAN 112307 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Emma Goldman Municipio de Acción terminada.

Ecatepec

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$4,009,159.22

Ejercido 2019: \$4,994,357.62

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de edificio de 2 niveles, trabajos de cimentación, superestructura y acabados.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 644 alumnos.



FICHA 542 IMIFE

SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA 112400 MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN GENERAL 020501010105

ANTECEDENTES

Mantenimiento Y/O Rehabilitación General En La Escuela Secundaria Felipe Villanueva Municipio De Tecámac

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ojo de Agua

Costo de la Obra en 2019: \$2,524,681.09

Ejercido 2019: \$2,517,280.28

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 02/01/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de demolición y reconstrucción de aulas y taller y rehabilitación de aulas existentes.

TRABAJOS EJECUTADOS

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 900 alumnos.



FICHA 543 **IMIFE**

SECUNDARIA SIMÓN BOLÍVAR 112420 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Terminación de Rehabilitación del Plantel Secundaria Simón Bolívar Acción en proceso.

en el Municipio de Tonanitla

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 240 alumnos.

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Santa María Tonanitla

Costo de la Obra en 2019: \$786,822.34

Ejercido 2019: \$780,772.94

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de 7 aulas, núcleo sanitario y obra exterior.



FICHA 544 **IMIFE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECAMAC 115138 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en la Universidad de Tecámac en el Municipio de Acción terminada.

Tecámac estado de México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Cabecera Municipal Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$2,658,281.70

Ejercido 2019: \$2,658,281.70

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de la construcción de un edificio de docencia de dos niveles.



FICHA 545 IMIFE

CENTROS DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 119 GERTRUDIS BOCANEGRA LAZO 115128 IMPERMEABILIZACIÓN 0205010105

Aproximadamente 750 alumnos.

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Impermeabilización en CETIS Estado de México. Acción terminada.

Programa de Acciones para el

DATOS GENERALES BENEFICIOS GENERADOS

Desarrollo.

Localización: Aragón de las Fuentes

Costo de la Obra en 2019: \$815,447.52

Ejercido 2019: \$815,447.52

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

PROGRAMA:

Impermeabilización de edificios.



FICHA 546 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICAL 282 112366 CONSTRUCCIÓN DE LUM Y REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Preparatoria Oficial 282 en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$510,309.53

Ejercido 2019: \$503,852.97

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de luminaria y rehabilitación de sala de usos múltiples, escalera y obra exterior.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 750 alumnos.



FICHA 547 **IMIFE**

SECUNDARIA MARIANO AZUELA 112424 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en escuela secundaria mariana azuela en el Municipio

de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$115,443.80

Ejercido 2019: \$114,863.79

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de desmontaje de estructura de madera y rehabilitación de 6 aulas.

Acción terminada.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 548 IMIFE

SECUNDARIA TECNICA CUAUHTÉMOCZIN 112076 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Secundaria Técnica Cuauhtémoczin En El Acción terminada.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$694,084.17

Ejercido 2019: \$690,589.26

Fecha de Inicio: 09/09/2019


Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de pintura, aplanados e instalación eléctrica.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 300 alumnos.

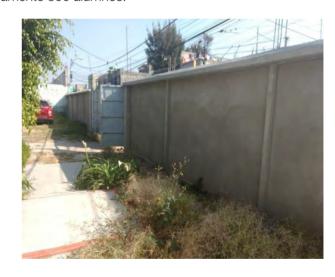

FICHA 549 **IMIFE**

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 307 111986 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Preparatoria 307 en el Municipio de Ecatepec Acción en proceso.

estado de Otumba

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Tlalmimilolpa

Costo de la Obra en 2019: \$650,000.00

Ejercido 2019: \$643,772.90

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de un aula tipo regional.



FICHA 550 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.0772, LUIS G. URBINA 113020 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Secundaria Oficial No.0772, Luis G. Urbina Acción terminada. en el Municipio de Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$2,435,503.92

Ejercido 2019: \$2,431,801.19

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de impermeabilizante pintura y aplanados.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 551 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 258 112260 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

Rehabilitación en Escuela Preparatoria Oficial Numero 258 en el Acción en proceso Municipio de Ecatepec estado de México.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$1,460,000.00

Ejercido 2019: \$1,458,264.64

Fecha de Inicio: 04/12/2019

Fecha de Terminación: 31/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación, pintura, rehabilitación.

TRABAJOS EJECUTADOS

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 300 alumnos.



FICHA 552 **IMIFE**

PREPARATORIA MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERO 112394 MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN GENERAL 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Preparatoria María Del Carmen Molina Acción terminada.

Rivero en el Municipio de Tecámac estado de México

DATOS GENERALES

BENEFICIOS GENERADOS

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Localización: Ojo de Agua

Costo de la Obra en 2019: \$191,611.11

Ejercido 2019: \$188,159.30

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de barda perimetral y aulas, trabajos de aplanados pintura y reforzamiento de columnas



FICHA 553 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 94 112234 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Preparatoria Oficial Numero 94 En El Acción terminada.

Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$153,734.18

Ejercido 2019: \$75,551.64

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición aulas en mal estado y rehabilitación de 4 existentes.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 554 IMIFE

SECUNDARIA TEPOCHCALLI 112392 MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN GENERAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Tepochcalli en el Municipio de Acción terminada.

Ecatepec estado de México

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ecatepec de Morelos

Costo de la Obra en 2019: \$109,708.40

Ejercido 2019: \$107,533.40

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Trabajos de pintura en 3 edificios de 3 niveles.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 400 alumnos.



FICHA 555 **IMIFE**

SECUNDARIA TÉCNICA 56 JOSÉ ANTONIO TORRES 112415 TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Secundaria Técnica 56 José Antonio Acción terminada.

Torres En El Municipio De Ecatepec Estado De México

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el PROGRAMA:

Desarrollo.

Ecatepec de Morelos Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$992,155.33

Ejercido 2019: \$920,737.23

Fecha de Inicio: 09/09/2019

Fecha de Terminación: 23/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición de edificio de 12 ejes de 2 niveles y terminación de cancha de futbol.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 500 alumnos.



FICHA 556 IMIFE

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NUMERO 0056 JOSÉ ANTONIO TORRES 114386-209 PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación en Escuela Secundaria Técnica Industrial Y Comercial Numero 0056 José Antonio Torres en el Municipio de Ecatepec estado de México

BENEFICIOS GENERADOS

Acción en proceso

DATOS GENERALES Aproximadamente 500 alumnos.

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Localización: Ejido de Santa María Tulpetlac

Costo de la Obra en 2019: \$100,000.00

Ejercido 2019: \$89,000.00

Fecha de Inicio: 26/07/2019

Fecha de Terminación: 24/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Primera etapa de sustitución de edificio



FICHA 557 **IMIFF**

TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0626 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 111349 REPARACION DE LIGERAS FISURAS EN TRABES Y MUROS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reparación de Ligeras Fisuras en Trabes y Muros de la Telesecundaria Obra en proceso. Oficial Numero 0626 Ignacio Manuel Altamirano ubicada en San Diego, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 160 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

San Diego, Villa Guerrero, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$21,256.62

Ejercido 2019: \$20,411.16

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 23/06/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 558 **IMIFF**

TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0169 HORACIO ZÚÑIGA 111412 REPARACION DE DAÑOS EN TRABES Y COLUMNAS 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reparación de Daños en Trabes y Columnas de la Telesecundaria Obra en proceso. Oficial Numero 0169 Horacio Zúñiga en la localidad de San José, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 480 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

San José, Villa Guerrero, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$406,855.41

Ejercido 2019: \$396,060.05

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 22/08/2019

DATOS TÉCNICOS:

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de trabes y columnas de concreto armado, muros de tabique rojo recocido, acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 559 **IMIFE**

TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0317 JOSÉ MARÍA VELASCO 111358 RECONSTRUCCIÓN DEL AULA A 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Reconstrucción del Aula A de la Telesecundaria Oficial Numero 0317 Obra en proceso. José María Velasco ubicada en Santa Lucía, Ocuilan, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 150 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Santa Lucía, Ocuilan, México.

Costo de la Obra en 2019: \$3213,199.51

Ejercido 2019: \$3,211,067.50

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019



DATOS TÉCNICOS:

Construcción de 3 edificios total 5 aulas y sanitarios.

FICHA 560 **IMIFF**

COLEGIO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO GUADALUPE VICTORIA, ZUMPAHUACÁN 111390 SE CONSIDERA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS MÁS SEVEROS COMO SON EN MUROS EN DOS LOSAS DE AULAS Y REPARACIÓN DE **ACABADOS** 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Se Considera La Reparación De Los Daños Más Severos Como Son Obra en proceso. En Muros En Dos Losas De Aulas Y Reparación De Acabados en el

CBT Guadalupe Victoria ubicado en Zumpahuacán, México. BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 250 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Zumpahuacán, México.

Costo de la Obra en 2019: \$4,500,000.00

Ejercido 2019: \$4,485,000.00

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 21/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Sustitución de área administrativa y aula tipo regional.



FICHA 561 **IMIFF**

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0210 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 111387 SE DEMOLERÁN LOS ESPACIOS AFECTADOS POR COMPLETO Y SE REALIZARA LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Se Demolerán Los Espacios Afectados Por Completo Y Se Realizara Obra en proceso La Reconstrucción Total de la Escuela Secundaria Oficial Numero 0210 Licenciado Adolfo López Mateos ubicada en Zumpahuacán, BENEFICIOS GENERADOS México.

Aproximadamente 220 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Zumpahuacán, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$5,772,000.00

Ejercido 2019: \$5,744,279.70

Fecha de Inicio: 22/06/2019

Fecha de Terminación: 19/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de servicios sanitarios.



FICHA 562 IMIFE

TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA 112479 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación de la Telesecundaria Francisco Villa en Obra en proceso. Tenancingo de Degollado, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 240 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Tenancingo de Degollado, México.

Costo de la Obra en 2019: \$62,615.37

Ejercido 2019: \$60,613.50

Fecha de Inicio: 17/08/ 2019

Fecha de Terminación: 14/11/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en barda perimetral, e impermeabilizante.



FICHA 563 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0086 LICENCIADO ABEL C. SALAZAR 111808 REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación del Plantel Escuela Secundaria Oficial No 0086 Obra en proceso. Licenciado Abel C. Salazar ubicada en la localidad de Lerma de Villada, Lerma, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 280 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Lerma de Villada, Lerma, México.

Costo de la Obra en 2019: \$149,847.25

Ejercido 2019: \$147,971.51

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 564 **IMIFF**

TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0752 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 112504 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en la Telesecundaria Oficial Numero Acción terminada. 0752 José María Morelos y Pavón ubicada en la comunidad de Zanjillas San Bartolomé, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 200 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

Zanjillas San Bartolomé, Villa Guerrero, Localización:

México.

Costo de la Obra en 2019: \$187,282.22

Ejercido 2019: \$186,520.10

Fecha de Inicio: 06/08/ 2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante y rehabilitación de sanitarios.



FICHA 565 **IMIFF**

TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0556 GUADALUPE VICTORIA 112522 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación en la Telesecundaria Oficial Numero Acción terminada. 0556 Guadalupe Victoria ubicada en San Gaspar, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES

Aproximadamente 80 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: San Gaspar, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$43,101.36

Ejercido 2019: \$42,140.87

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 05/09/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 566 **IMIFE**

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL NUMERO 36 SAN JOSÉ V 112491 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Primer Etapa de Rehabilitación del Colegio de Bachilleres del Estado Acción terminada. de México Plantel Numero 36 San José V ubicado en San José, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 100 estudiantes.

DATOS GENERALES

Programa de Acciones para el Desarrollo PROGRAMA:

San José, Villa Guerrero, México. Localización:

Costo de la Obra en 2019: \$11,055,35

Ejercido 2019: \$10,791.21

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 04/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Zapata y contratrabes de concreto armado, muro de tabique rojo recocido y acabado de pintura.



FICHA 567 **IMIFF**

SECUNDARIA GENERAL OFICIAL NUMERO 0355 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 112494 REHABILITACIÓN DE AULA Y BAÑO 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de Aula y Baño en la Secundaria General Oficial No. Acción terminada. 0355 Sebastián Lerdo de Tejada ubicada en El Carmen, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 160 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: El Carmen, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$59,675.61

Ejercido 2019: \$57,972.53

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 04/10/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 568 **IMIFE**

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0310 ANTONIO DE MENDOZA 112500 PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN 020501010105

TRABAJOS EJECUTADOS **ANTECEDENTES**

Primer Etapa de Rehabilitación de la Escuela Secundaria Oficial No. Acción terminada. 0310 Antonio de Mendoza ubicada en Porfirio Diaz, Villa Guerrero, México.

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 80 estudiantes.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo

Localización: Porfirio Díaz, Villa Guerrero, México.

Costo de la Obra en 2019: \$137,809.61

Ejercido 2019: \$136,783.71

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Acabados piso de loseta y pintura en plafón y muros, aluminio e impermeabilizante.



FICHA 569 **IMIFF**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA ESTADO DE MÉXICO PLANTEL SANTIAGO TIANGUISTENCO 111424 REHABILITACIÓN DE 9 AULAS, 2 TALLERES DE CÓMPUTO, 200 ML DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de 9 Aulas, 2 Talleres de Cómputo, 200 ml de Barda Acción terminada. Perimetral en el CONALEP Estado de México Plantel Santiago Tianguistenco ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, BENEFICIOS GENERADOS Tianguistenco, México.

Aproximadamente 24 estudiantes.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el Desarrollo.

Localización: Santiago Tianguistenco de Galeana,

Tianguistenco, México.

Costo de la Obra en 2019: \$3,221,497.21

Ejercido 2019: \$1,621,143.91

Fecha de Inicio: 25/05/2019

Fecha de Terminación: 23/07/2019

DATOS TÉCNICOS:

Demolición y construcción de andadores.



FICHA 570 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 300 111751 SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Preparatoria Oficial Numero 300 En El Acción en proceso. Municipio De Valle De Chalco Solidaridad Estado De México

Midnicipio de Valle de Ghaleo Golldandad Estado de Mexico

DATOS GENERALES

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Xico

Costo de la Obra en 2019: \$4,000,000.00

Ejercido 2019: \$3,989,346.67

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 03/12/2019

DATOS TÉCNICOS:

Firme de concreto, aplanado de mezcla en muros, aplanado de mezcla en plafón. Acabados: pintura vinílica en muros, zoclos, trabes y plafón.

BENEFICIOS GENERADOS

Aproximadamente 600 alumnos.



FICHA 571 IMIFE

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 29 111740 REHABILITACIÓN 020501010105

ANTECEDENTES TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación En Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, en el Acción terminada. Municipio de Tepetlixpa Solidaridad Estado De México

BENEFICIOS GENERADOS DATOS GENERALES

Aproximadamente 600 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Localización: Tepetlixpa

Costo de la Obra en 2019: \$1,762,986.68

Desarrollo.

Ejercido 2019: \$1,761,719.84

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de Terminación: 20/01/2019

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de aulas en escuela preparatoria.



FICHA 572 **IMIFE**

SECUNDARIA OFICCIAL NUMERO 0109 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 111752 CONSTRUCCIÓN DE AULAS 020501010105

TRABAJOS EJECUTADOS **ANTECEDENTES**

Rehabilitación En Escuela Secundaria Oficial Numero 0109 Josefa Acción terminada. Ortiz De Domínguez En El Municipio De Ozumba Solidaridad Estado

De México

BENEFICIOS GENERADOS

DATOS GENERALES Aproximadamente 500 alumnos.

PROGRAMA: Programa de Acciones para el

Desarrollo.

Localización: Ozumba de Alzate

Costo de la Obra en 2019: \$4,500,000.00

Ejercido 2019: \$4,499,218.44

Fecha de Inicio: 06/08/2019

Fecha de Terminación: 02/01/2019

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de aulas tipo regional.

